

都市計画道路 宮沢根白石線（舟丁工区） 工事のお知らせ

作業状況

①コンクリート打設状況

コンクリートの打設は1月中旬、下旬の2回に分けて行う予定です。
(写真は1月15日の打設状況です。)




②全景

現在の全景です。2月から3、4ブロックの施工に取り掛かります。七郷堀へ通水を行いながら、施工をしています。



今後の作業内容

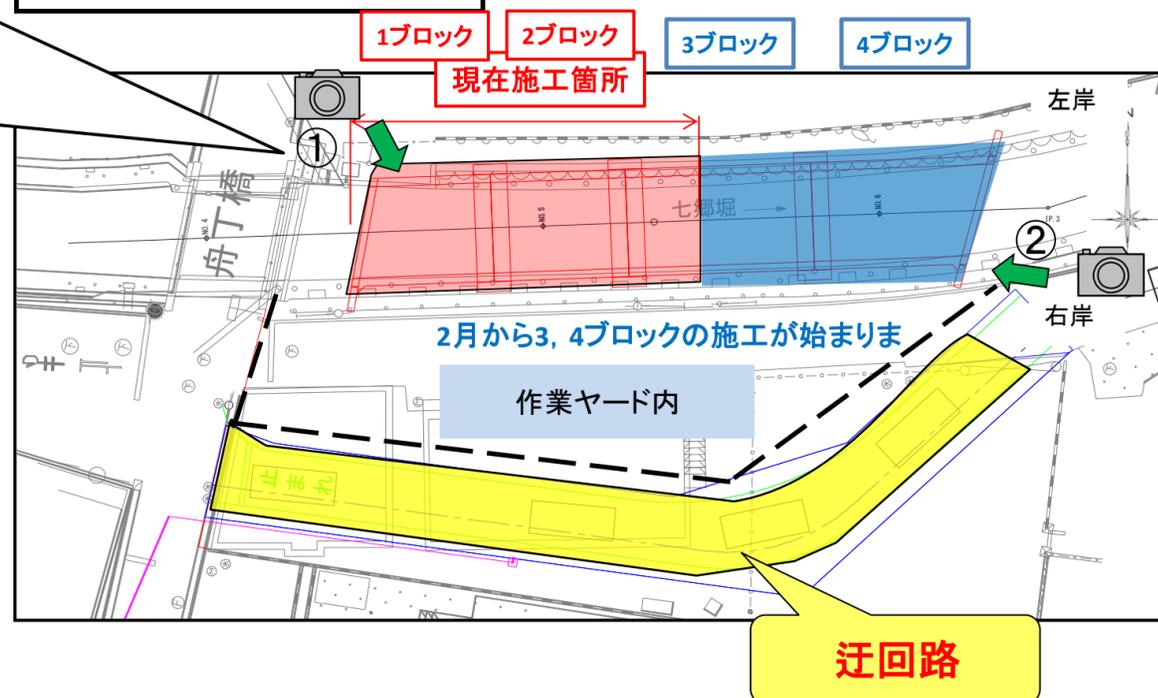

工程表

工種・内容	12月	1月	2月	3月	4月	5月	備考
カルバート工 土工			1~2ブロック埋戻 3~4ブロック掘削		3~4ブロック埋戻		
カルバート工 本体	1~2ブロック		3~4ブロック				工事完了
構造物撤去工・復旧工							

お問い合わせ先

発注者 仙台市建設局南道路建設課
道路第一係
担当 齊藤龍也 成田幸久
電話番号 022-214-8378

受注者 サイト工業株式会社
担当 高橋誠
電話番号 022-355-8123

地域の皆様には、日ごろより仙台市の行政運営にご理解、ご協力を頂き心より感謝申し上げます。

宮沢根白石線(舟丁工区)七郷堀水路改築工事は10月下旬より現場着手致しました。現在は、1、2ブロックの施工を行っています。

1、2ブロックは2月中に作業が完了する予定であり、その後3、4ブロックの施工に取り掛かります。2月から構造物の取り壊し作業を行いますので、重機等の安全に配慮しつつ施工を行ってまいります。

工事のお問い合わせ・お気づきの点がございましたらお手数ですが、下記連絡先までご連絡をお願いします。
