

皆様には、日ごろ公共事業にご協力とご理解をいただき、心より感謝申し上げます。

《工事概要》

本工事は、国道286号バイパス（南赤石工区）整備事業の一環として、(市)湯元上原線において道路拡幅改良工事を施行するものです。

《進捗状況》

昨年の4月中旬より掘削工に着手し 現在、71%程度完了しています。2月以降も引き続き残土の搬出作業を行います。

進捗写真 【南から北側を撮影】
(上空から撮影) R1.11.22



進捗写真 【南から北側を撮影】
(上空から撮影) R2.1.10



約2か月で約1m下がりました。

進捗写真 【南から北側を撮影】
(上空から撮影) H30.12.22
着手前



進捗写真 【南から北側を撮影】
(上空から撮影) R2.1.10
現在



南側から順次、側溝を設置しています。

側溝

土曜日、日曜日、祝日の残土搬出は行いません。

12月～1月の1日のダンプ搬出台数は、42～84台でした。2月～3月は60台程度（10台×6往復程度）で搬出予定です。


残土搬出に際しては、運転者の安全教育を徹底し、安全運行に努めます。

《工事の順序》

下図の『』の順序で左右交互に山を掘削して道路の位置を下げる予定です。

掘削予定


2月... の予定
3月... の予定

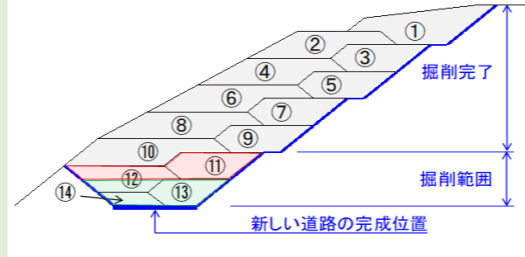

残土の積み込み状況



掘削作業中の交通規制
(片側交互通行)

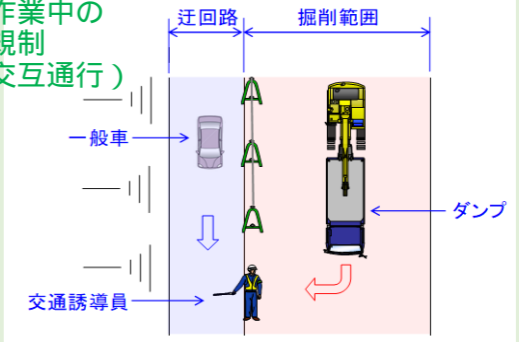


掘削作業中の規制状況



《工事中の道路規制》

2月・3月の施工範囲（昼間は交通誘導員が規制対応）

夜間信号による規制範囲(これまでと同じ規制区間です。)

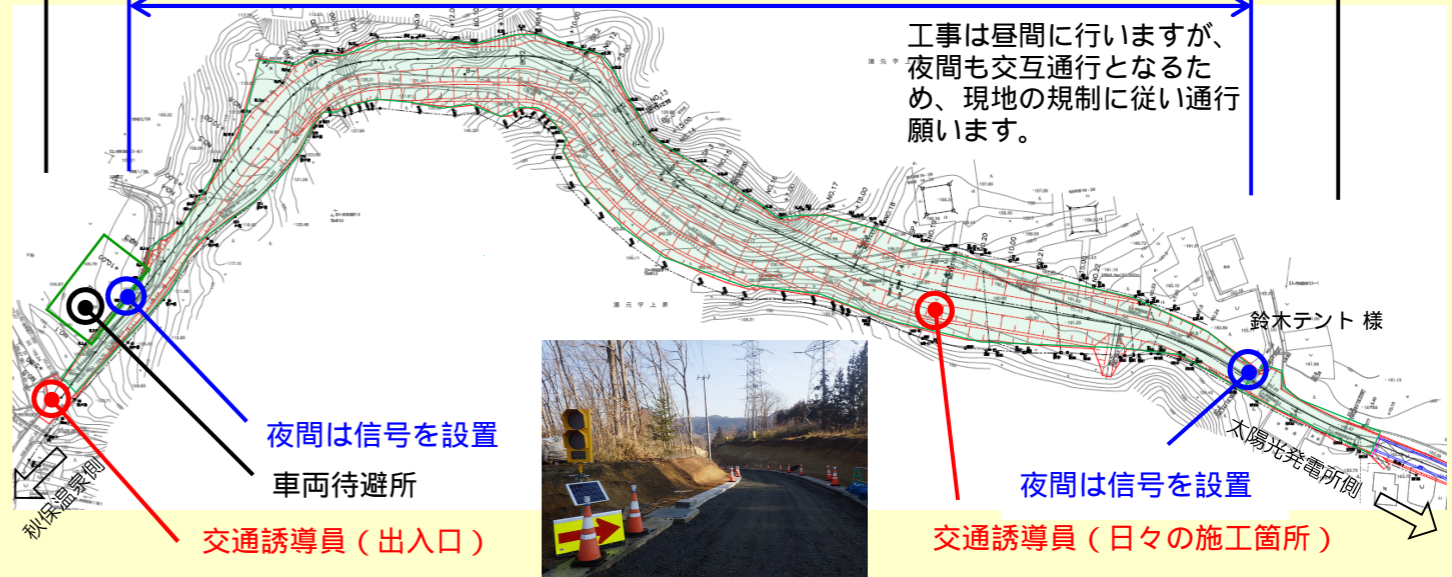

工事は昼間に行いますが、夜間も交互通行となるため、現地の規制に従い通行願います。

夜間は信号を設置
車両待避所

夜間は信号を設置

交通誘導員（出入口）

交通誘導員（日々の施工箇所）

地域の皆様にはご不便やご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。交通安全には万全を期しますが、お気づきの点などございましたら、気軽にご相談いただくと幸いです。

お問い合わせ先：深松組 022-393-6571

現場代理人 相澤 070-2011-1166

監理技術者 田村 080-5744-9117

『道路工事だより』は2ヶ月毎に予定しています。
