



# 工事のお知らせ

地域の皆様には、日頃より市政に対し、ご理解とご協力を頂き、誠にありがとうございます。  
 6月現在までの施工状況ですが、4月末に大型クレーンを入場させ5月の連休終了後から、工場から現場へ製品を順次搬入し橋桁の架設を行い完了しました。  
 今後の工程ですが、6月末より床版工を行っていきます。型枠設置、鉄筋組立、7月後半にコンクリート打設予定になっております。  
 地域の皆様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、振動・騒音等の低減に努力し、工事を安全に進めてまいります。また、今後も引き続き、交通の安全確保のため、周辺道路の車両誘導を適宜行ってまいります。  
 工事に関して、気になる点・ご要望等ありましたら、恐れ入りますが、現場担当までご連絡願います。

## 側面図

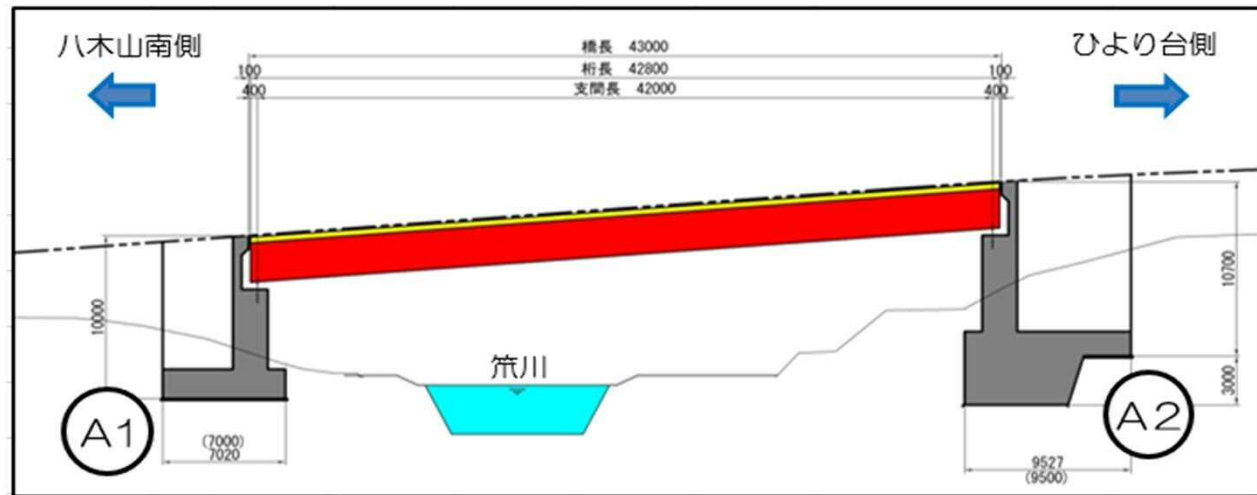

## 断面図

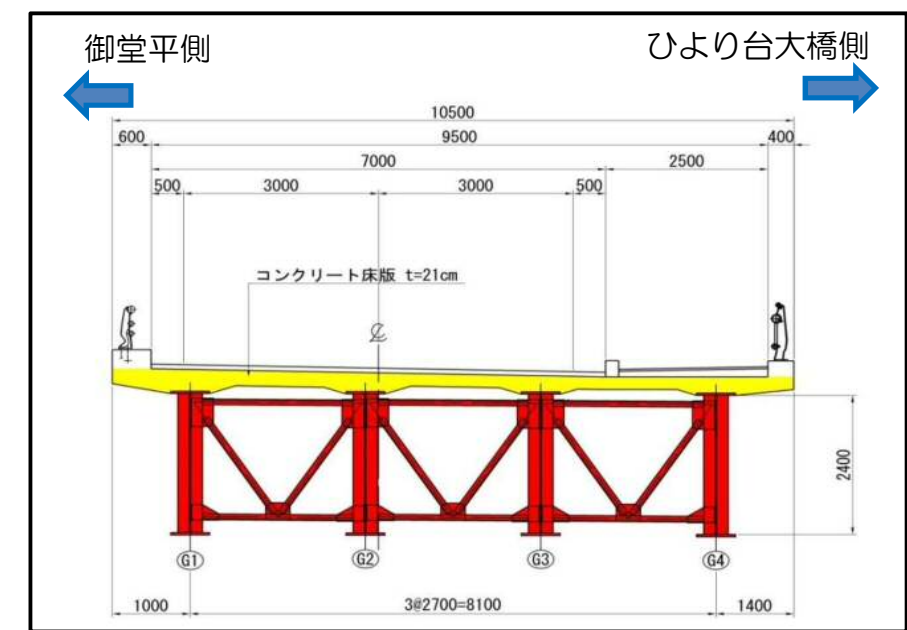

橋桁（赤色）の架設が、完了いたしました。今後は、その上にコンクリートの床版（黄色）を施工します。

## 今後の施工予定表

工種	内容	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
準備工	事前調査・測量 保安設備等現場内準備	●						
鋼橋架設工	クレーン搬入・ベント設置 桁搬入・地組・架設・足場		●	●	●			●
床版工	型枠設置・鉄筋組立 コンクリート打設				●	●	●	
付属物工	排水装置設置 防護柵設置						●	●
仮設工	作業ヤード・搬入路整備	●						●

## 施工写真



橋桁をボルトでジョイントしながら、橋台～橋台まで到達させていきます。



最終ブロックの架設状況です。



橋桁の架設が、完了しました。

## 問い合わせ先

◎施工業者 株式会社中央コーポレーション  
 東北営業所：仙台市太白区南大野田3-1第3エステート斎藤103号室  
 担当者： 田中 仁（連絡先：080-8217-1805）  
 高橋 義樹（連絡先：090-2608-4729）

◎発注者 仙台市 建設局 道路部 南道路建設課 道路第二係  
 担当者： 藤崎 雅史 ・ 小野寺 颯希  
 連絡先： TEL 022-261-1111（内線4735・4737）
