

【第 7 号】

都市計画道路

みなみこいずみもにわせん みやざわばしこうく こうじ


南小泉茂庭線(宮沢橋工区)工事だより

【ごあいさつ】

日頃より仙台市政にご理解・ご協力を頂き、心より感謝申し上げます。
今号は新しい工事の着手についてお知らせします。
お気づきの点がございましたら、下記担当までご連絡をお願いします。

「若林区側の橋台工事」と「六郷堀の暗渠化工事」に着手します

工事は安全に十分配慮し、進めてまいります。工事に関するご意見やお気づきの点・改善点などがございましたら、下記の施工業者までご連絡ください。

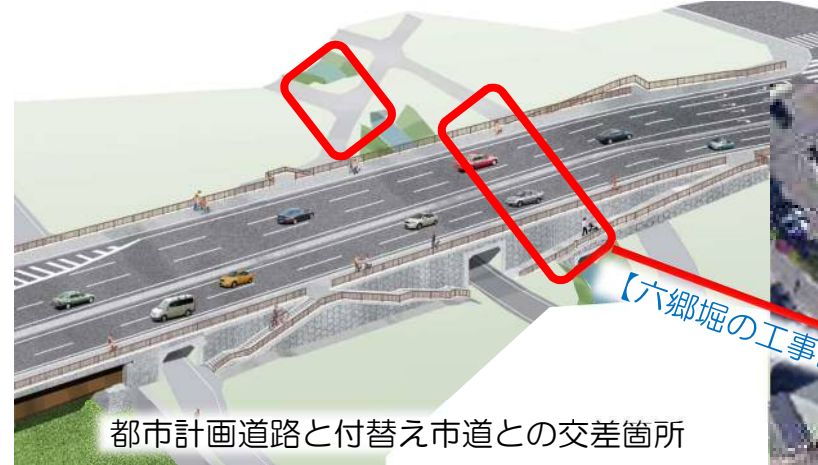

都市計画道路と付替え市道との交差箇所

六郷堀の暗渠化工事について

- 令和3年7月末から六郷堀の樹木伐採を行います。
- 用水の水が少なくなる令和3年9月から、六郷堀をせき止め、堀の暗渠化工事を進めていきます。
- 堀をせき止めている期間中、上流から流れてくる用水は排水ポンプを用いて、下流へ流します。
- 工事用車両の通行の際は、十分に速度を落とし、交通安全に努めます。
(石名坂堰場1号線は20km/hを自主規制速度)



六郷堀工事用車両出入口
(誘導員を配置します)

急患センター

暗渠

石名坂堰場1号線

六郷堀

若林区側橋台

宮沢橋

宮沢緑地

【若林区側橋台の工事箇所】

【六郷堀の工事箇所】

「太白区側橋台工事」の期間・河川管理用通路(太白区側)の通行止めの延長について



令和3年7月時点

今回の橋台工事は、河川内の限られた期間内での工事であり、当初予定していた令和3年6月末までに全ての工事を完了できませんでした。
残る護岸工事や土の埋戻し工事を、川の水が少なくなる11月以降に施工するため、工事の期間及び河川管理用通路の通行止めを令和4年3月末まで延長いたします。
地域の皆さまには、ご不便・ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

若林区側橋台工事について

- 令和3年10月から堤防の内側(住宅地側)の工事に着手します。
- 令和3年11月から川の中の工事に着手予定です。
- 宮沢緑地の使い方や工事用車両の通行など、詳しい工事の内容は、改めて工事説明会や工事だよりを通じて、地域の皆さまにお知らせします。



若林区側橋台

橋脚
(着手済み)

太白区側の橋台
(着手済み)

大年寺山

【事業に関するお問合せ・工事の発注者】
 仙台市役所建設局 道路部 南道路建設課
 道路第一係 担当：及川(おいかわ)・今成(いまなり)
 電話：022-214-8378(係直通)

【六郷堀暗渠化工事に関するお問合せ・工事の施工業者】
 株式会社広瀬組
 担当：工藤(くどう)
 電話：022-392-4620(会社)

【若林区側橋台工事に関するお問合せ・工事の施工業者】
 株式会社橋本店
 担当：山田(やまだ)
 電話：022-748-4075(現場事務所)
