

地域住民の皆様へ

工事のお知らせ


令和3年7月吉日
【第4号】

(市) 御堂平2号線道路改良工事 (その2)


工事の進捗について

地域の皆様には、日頃より道路工事に対し、ご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。
現在工事は約90%程度完了しており、「西高前線の円形交差点改良」や「新設道路の最終整備」、「八木山南側階段新設」の施工を行っております。

地域の皆様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、引き続き騒音・振動等の低減に努め、工事を進めてまいります。
工事に関して、お気づきの点・ご要望等がございましたら、恐れ入りますが、現場担当までご連絡くださいますようお願い致します。

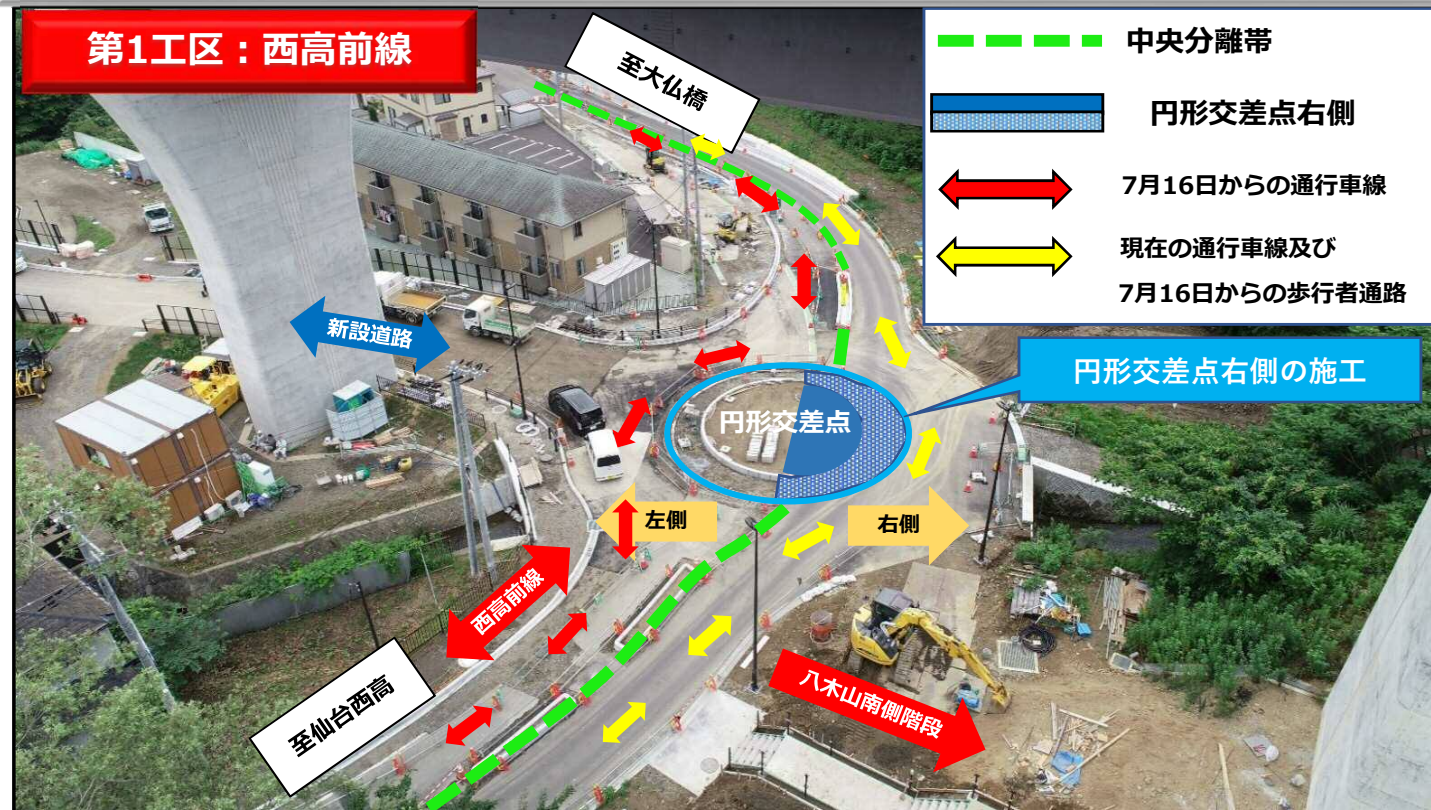

西高前線左側の側溝と円形交差点の築造が完了し、今後は車線を切替えて(右側ページの規制イメージ図参照)道路右側の円形交差点を築造を行った上、7月下旬頃から舗装を施工していく予定です。

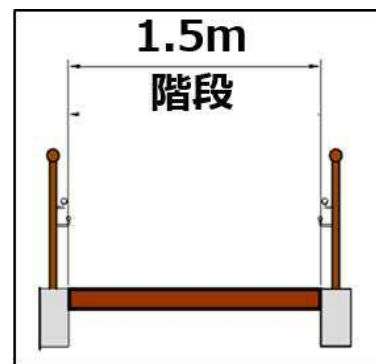

八木山南側階段につきましては、現在最下段付近を施工しており、8月上旬頃の完成を予定しております。

なお、詳細な供用開始時期は予告看板により、近隣の皆様へお知らせ致します。





目隠し柵の設置が完了し、今後は橋面と道路の舗装を施工する予定です。
なお、新設道路の供用開始は8月下旬を予定しておりますが、詳細な時期については予告看板等により、近隣の皆様へお知らせ致します。



5月中旬より供用を開始致しました。



7月上旬より供用を開始致しました。

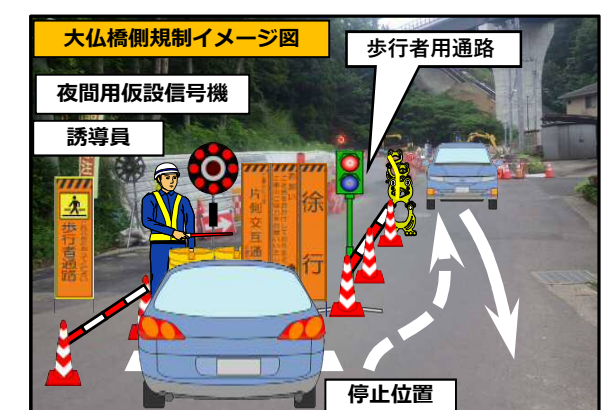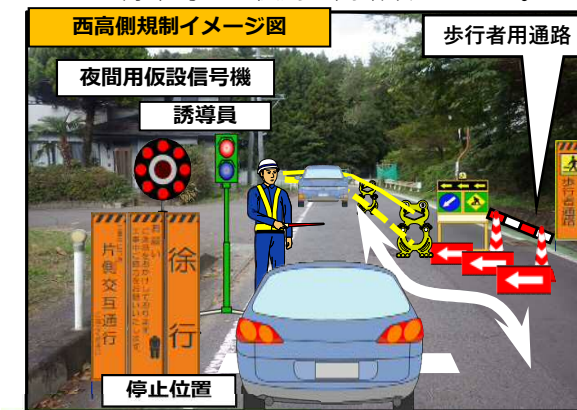

予定工程表

施工箇所	令和3年						備考
	7月			8月			
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	
西高前線の円形交差点改良	階段新設 円形交差点改良・舗装工・防護柵工・区画線工						・7月16日より西高前線の規制切替 (左側：通行車線、右側：歩行者通路)
新設道路の最終整備	舗装工・区画線工						
ひより台側階段	階段新設・斜路階段拡幅						・新設階段5月中旬より供用開始 ・斜路階段7月上旬より供用開始

◎発注者：仙台市 建設局 道路部 南道路建設課 道路第二係
担当者：小野寺・松田
連絡先：Tel 022-214-8409

◎施工業者：山辰建設 株式会社 Tel.022-248-3341
担当者：阿部和範
携帯：080-7414-2992
