


【第2号】

(仮称)新馬橋橋梁等整備事業 工事だより


【ご挨拶】

地域の皆さまには日ごろより仙台市政にご理解・ご協力を賜り、心より感謝申し上げます。
 (仮称)新馬橋の建設に向け、令和2年10月より進めてきた古屋敷側の橋台工事が完成いたしました。
 引き続き、令和3年度は町東側の橋台工事に着手し、令和4年度に架設する橋桁の工場製作も行って参ります。
 工事期間中、ご不便やご迷惑をおかけいたしますが、安全に十分配慮し施工して参りますので
 ご理解・ご協力をお願いいたします。

【工事の場所】

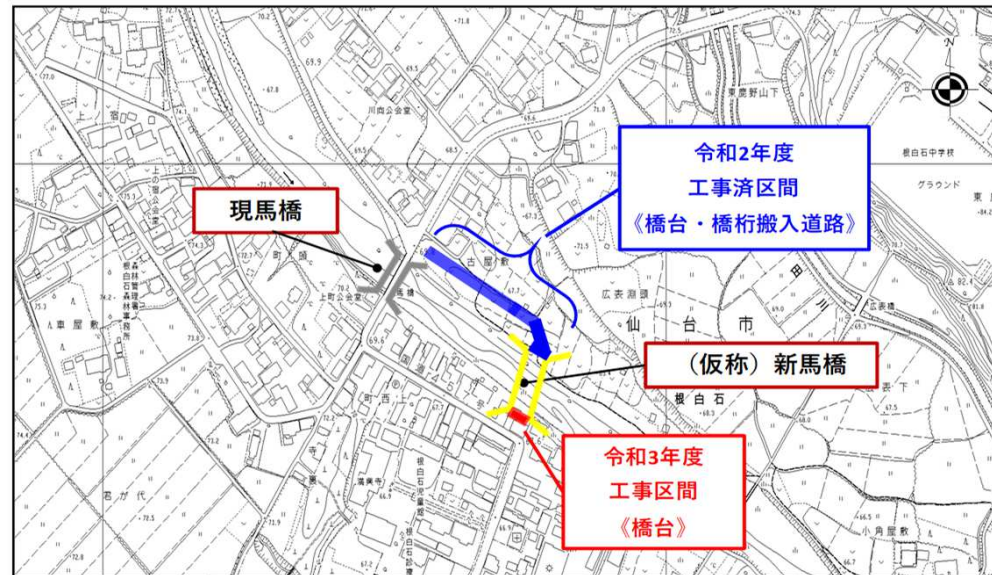

【(仮称)新馬橋の概要】

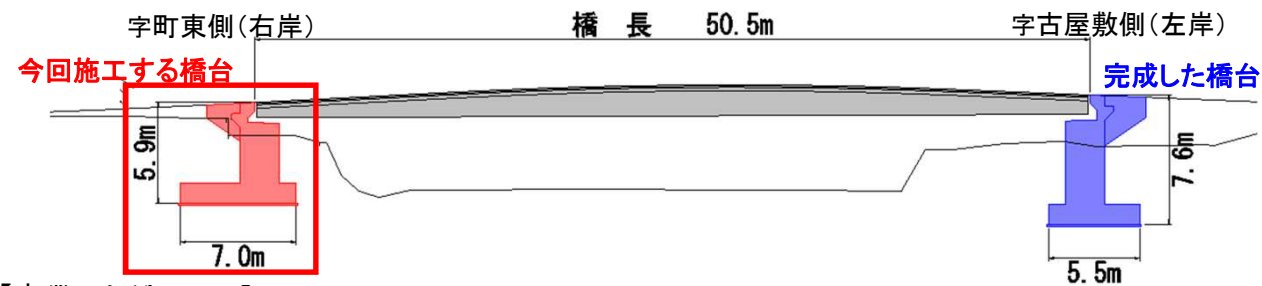

【事業スケジュール】

平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
	説明会・詳細設計						
	境界立会い	用地交渉・契約					
		【新馬橋】橋梁下部工 左岸側	【新馬橋】橋梁下部工 右岸側	【新馬橋】橋梁上部工	【新馬橋】道路整備工	【現馬橋】旧橋撤去工 橋梁下部工	【現馬橋】橋梁上部工
						交通切替	

※ 上記は現段階でのスケジュールであり、今後の関係機関・関係者協議により変更となる可能性があります。

【事業に関するお問い合わせ・工事の発注者】

仙台市 泉区 建設部 道路課 道路建設係
 担当：荻原 和樹，臼井 初美 TEL：022-372-3111(内線6442)

工事の進捗状況

古屋敷側の橋台が完成しました




側面



正面

橋桁を搬入する道路が完成しました

※この道路は将来的に市道町東古屋敷線として整備されます。



現況



完成イメージ

【令和3年度工事の工程】

令和3年度		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
橋台工 (町東側)	鋼矢板圧入		→							
	掘削			→						
	コンクリート打設・埋戻し				→	→	→	→	→	→
護岸工	ブロック積み擁壁							→	→	→
上部工	橋桁工場製作									→

【地域の皆さまへ】
 お気づきの点がございましたら、下記担当までご連絡ください。

【保護者の皆さまへ】
 交通誘導員を配置し安全には十分配慮いたしますが、工事現場へは近づかないよう、お子様へのご指導をお願いします。

【工事に関するお問い合わせ・工事の施工業者】

河北建設株式会社 TEL：022-245-5351
 担当：鹿野 賢二 携帯：090-8785-8597

