


工事のお知らせ

地域の皆様には、日頃より市政に対し、ご理解とご協力を頂き、誠にありがとうございます。
9月現在までの施工状況ですが、A1側(八木山南側)では橋台躯体工(鉄筋・型枠)、A2側(ひより台側)では作業土工(掘削床堀)の施工をしています。

A2側では岩盤掘削のため重機が稼働しておりますが、なるべく最小限の出力で重機を動かして、極力騒音・振動が発生しないよう施工しております。9月末までには掘削完了予定です。
10月以降は、A1・A2共に橋台躯体工(鉄筋・型枠・コンクリート打設)を予定しております。
工事に関して、ご意見やお気づきの点などございましたら、お手数ですが現場担当者までご一報願います。

施工箇所

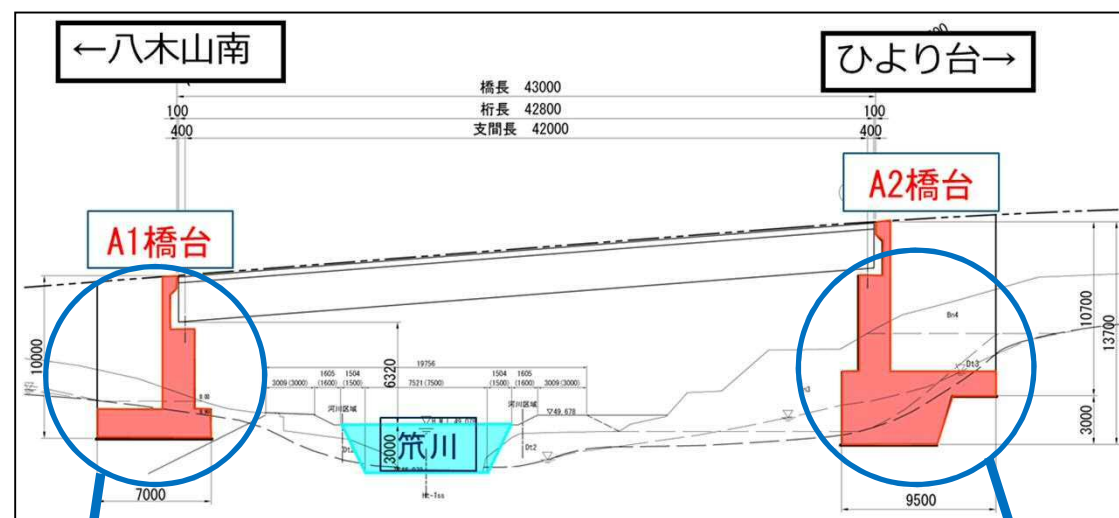

施工写真



足場を設置し、橋台の鉄筋を組み立てています。



ショベルカーで岩盤を掘削しています。

位置図



周辺道路の除草・清掃を行っています。



周辺道路のゴミ拾いをしています。

施工予定表

工種	種別	7月	8月	9月	10月	11月	12月
準備工	計画・測量	■					
作業土工	掘削・埋戻		■	■	■	■	■
橋台工	鉄筋・型枠・コンクリート			■	■	■	
仮設工	作業用通路	■					
道路土工	盛土・地下排水					■	■
片付け							■

問い合わせ先

◎施工業者 株式会社 広瀬組
 担当者：猪瀬 雄一
 連絡先：TEL 022-392-4620
 携帯 090-7931-4979

◎発注者 仙台市 建設局 道路部 南道路建設課 道路第二係
 担当者：加藤 泰輔
 連絡先：TEL 022-261-1111 (内線4736)
