


工事のお知らせ

地域の皆様には、日頃より市政に対し、ご理解とご協力を頂き、誠にありがとうございます。11月現在までの施工状況ですが、A1側(八木山南側)、A2側(ひより台側)とも橋台を築造しております。A1側は今月で橋台がほぼ完成し、A2側は橋台の高さ3m程度まで完了しており、12月末までには完成いたします。なお、全体の工事完了は2月中旬を予定しております。

地域の皆様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、振動・騒音等の低減に努力し 工事を進めてまいります。また、今後も引き続き、歩行者の安全確保のため、周辺道路の落葉清掃や除草を適宜行ってまいります。

工事に関して、気になる点・ご要望等ありましたら、恐れ入りますが、現場担当者までご連絡願います。

施工箇所

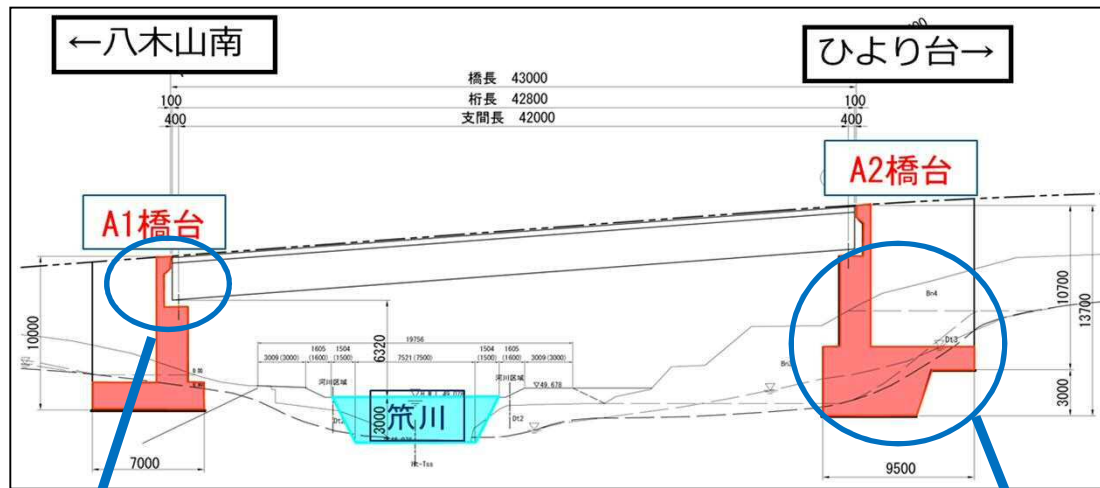

施工写真



コンクリート打設後の養生中です。



足場を設置し、橋台の型枠を組み立てています。

位置図



写真2



写真1

粉塵等の飛散防止のため、敷鉄板・防塵シートの仮囲いを設置しています。



周辺道路の落葉の清掃を行っています。



歩行者の安全確保のため除草を行っています。

今後の施工予定表

工種	種別	10月	11月	12月	1月	2月		
準備工	保安工・測量等	■						
作業土工	埋戻			■	■			
橋台工	鉄筋・型枠・コンクリート	■	■	■	■			
仮設工	作業用通路・敷鉄板片付け	■						
道路土工	盛土・地下排水			■		■		
片付け						■		

問い合わせ先

◎施工業者 株式会社 広瀬組
 担当者：猪瀬 雄一
 連絡先：TEL 022-392-4620
 携帯 090-7931-4979

◎発注者 仙台市 建設局 道路部 南道路建設課 道路第二係
 担当者：加藤 泰輔
 連絡先：TEL 022-261-1111 (内線4736)
