

道路工事だより

令和3年9月

地域の皆様には、日頃から公共工事に御協力を頂き厚く御礼申し上げます。
令和3年5月上旬に着手しました道路工事の進捗状況は、9月末で約75%完了する見込みとなっており、残りのおおまかな作業は舗装工事となりました。地域の皆様には大変ご迷惑をお掛けしておりますが、安全に注意し工事を進めてまいります。今後ともよろしくお願い致します。

工事概要

本工事は、国道286号バイパス（南赤石工区）整備事業の一環として、（市）湯元上原線において道路改良工事を施工するもので、昨年度完了した工事の続きです。

期間：令和3年5月6日から **令和3年11月30日** まで
※工期が延長になりました

時間：9:00 ～ 17:00

休工日：毎週日曜日は休工予定


その他、土曜日、祝日は工事車両が頻繁に出入りする作業は行いません

工期の延長について

令和3年9月30日の完成を目指し工事を進めてまいりましたが、天候や地盤からの湧水等の影響により工事が遅延したこと、またグルーピング工等を増工することになったことから、令和3年11月30日まで工期を延長することとなりました。ご理解・ご協力の程よろしくお願い致します。

グルーピング工法とは

道路の路面に複数の小さな溝を入れる事で、排水性の向上や、すべり抵抗の増大、凍結の抑制、雪解けの促進等をはかる工法です。本工事においては、道路の勾配が急な箇所に、幅9mm、深さ6mmの溝を60mm間隔で縦に入れます。

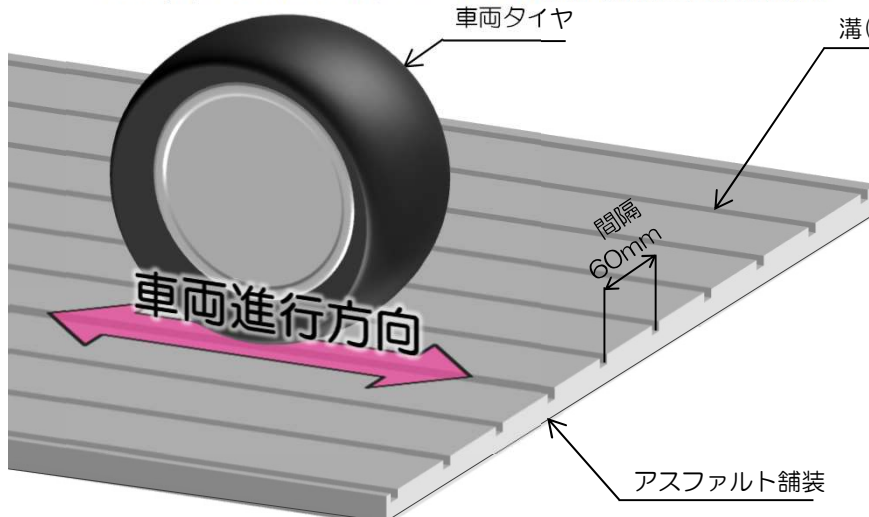


○工事施工例



工事場所及び工事車両運搬経路

大型ダンプ等が住宅街や温泉街を走行しますが、安全に注意して運行いたします。

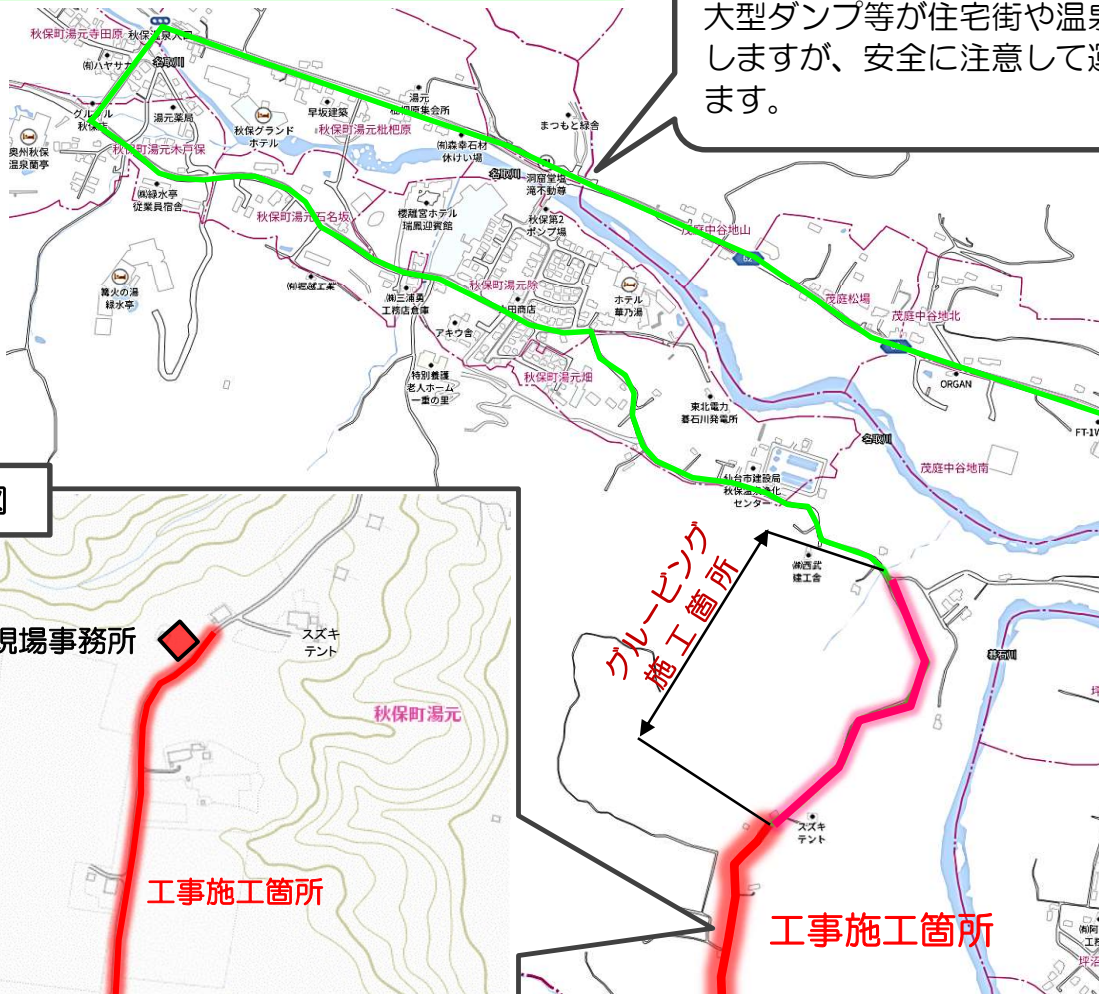

拡大図



工事施工箇所

工事車両運行経路

工事の進捗状況

9/22日現在の工事現場の状況です。

着手前



7月時点



現在



お気づきの点などございましたら、お気軽にご相談ください。

○工事に関するお問い合わせ先

工事施工業者：株式会社 荒鷹 TEL 022-248-2441

現場責任者：荒川 大輔 携帯 090-7525-5289

○事業に関するお問い合わせ先

発注者：仙台市建設局南道路建設課道路第二係

担当者：東海林 望

連絡先：TEL 022-261-1111 (内線4738)
