

この工事だよりは、仙台市のホームページでご覧いただけます。

「くらしの情報」 → 「住みよい街に→交通・道路」 → 道路 → 道路工事などのお知らせ → 工事のお知らせ(若林区、太白区、東部復興道路)



◆◆阿久戸橋(旧橋)の架け替え工事の進捗状況を報告します◆◆

- ・工事件名: 郡山折立線(大野田工区)橋梁撤去・下部工事
- ・作業内容: 阿久戸橋(旧橋)の撤去及び橋の土台となる橋台の設置
- ・これまでの作業状況(10月中旬現在)

① 旧橋撤去(1)



橋桁の切断状況



切断した橋桁の吊り上げ状況

橋桁の撤去完了

② 橋台新設(西側)



掘削・法面保護完了




鉄筋の組立状況



作業足場の組立状況

ポンプ車によるコンクリート打設状況

【整備イメージ図(本工事完了後のイメージです。)]

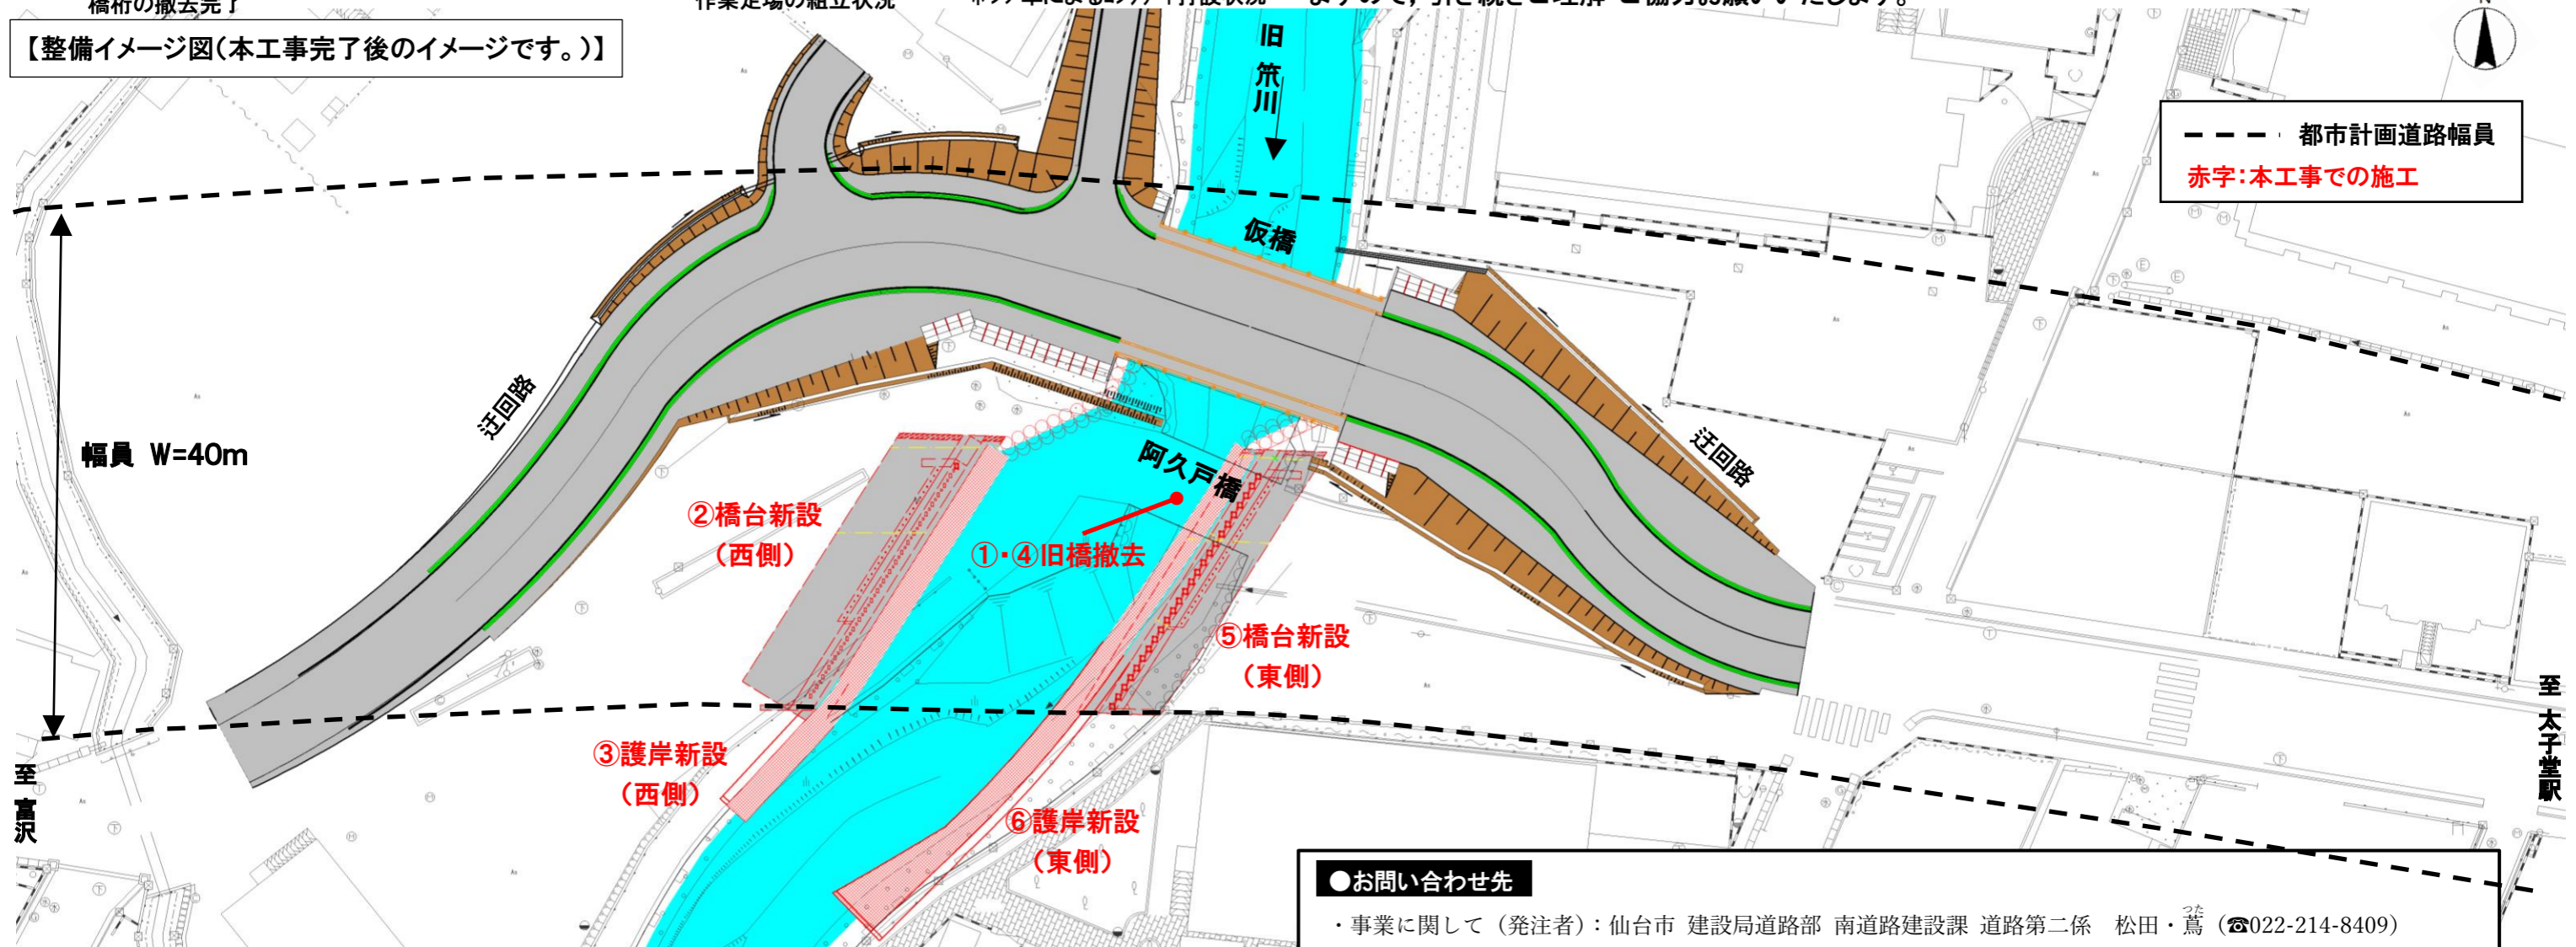

◆◆作業時間の変更と今後の予定について◆◆

- ・作業時間: (10月16日まで)8時30分 ~ 17時00分 → (10月17日以降)8時00分 ~ 17時00分
- ※7月の大雨の影響で工程が遅れているため、作業開始時間を早めております。

・今後の予定(各工種で前回から施工時期を変更しておりますが、工事完了時期に変更はございません。)

| 工種 | 内容 | 施工時期(予定) | 施工状況 |
|---------------|--------------------------|----------------|------|
| ① 旧橋撤去(1) | 旧橋の橋桁及び土台(西側)を撤去します | 令和4年3月~令和4年4月 | 完了 |
| ② 橋台新設(西側) | 掘削し、コンクリートで橋の土台を作り埋戻します | 令和4年5月~令和4年12月 | 施工中 |
| ③ 護岸新設(西側) | 既設の護岸を撤去し、新しい護岸を整備します | 令和5年1月~令和5年2月 | 未着手 |
| ④ 旧橋撤去(2) | 鋼矢板で締切り、掘削し、土台(東側)を撤去します | 令和5年10月~令和5年7月 | 施工中 |
| ⑤ 橋台新設(東側) | コンクリートで橋の土台を作り埋戻します | | 施工中 |
| ⑥ 護岸新設(東側) | 既設の護岸を撤去し、新しい護岸を整備します | 令和5年2月~令和5年5月 | 未着手 |
| ⑦ 残工事 後片付け | | 令和5年6月~令和5年8月 | 未着手 |

※新しい橋の橋桁の設置については、次の工事での施工となります。

作業時の騒音や交通規制により周辺にお住いの方にはご迷惑をおかけしますが、安全を最優先に工事を進めますので、引き続きご理解・ご協力をお願いいたします。

●お問い合わせ先

- ・事業に関して(発注者): 仙台市 建設局道路部 南道路建設課 道路第二係 松田・篤 (☎022-214-8409)
- ・橋梁工事に関して(施工業者): 河北建設 株式会社 横山(現場代理人) (☎022-245-5351)
