


この工事だよりは、市のホームページからもご覧いただけます。
 『くらしの情報』
 > 『住みよい街に』交通・道路
 > 『道路』道路工事などのお知らせ
 > 工事のお知らせ(若林区、太白区、東部復興道路)



スマホ等は
こちらから


〽-----阿久戸橋西側の暫定供用を開始します-----〽

安全で快適に道路を走行していただけるよう、幅員が狭い箇所の改善を目的とした道路工事(暫定整備)を実施しております。

本工事につきましては、**舗装が完了した箇所から順次交通を切り替えながら供用を開始し、令和8年6月末には暫定整備区間の全区間を供用開始**する予定としております。

なお、工事期間中は、交通の切り替え作業等に伴い交通規制を行う場合があります。通行の際は、現地に配置する交通誘導員の誘導に従って、安全に通行していただきますようお願いいたします。

- 工事期間 : 令和8年3月から令和8年7月31日まで(予定)
- 工事内容 : 舗装工事、交通切り替え等

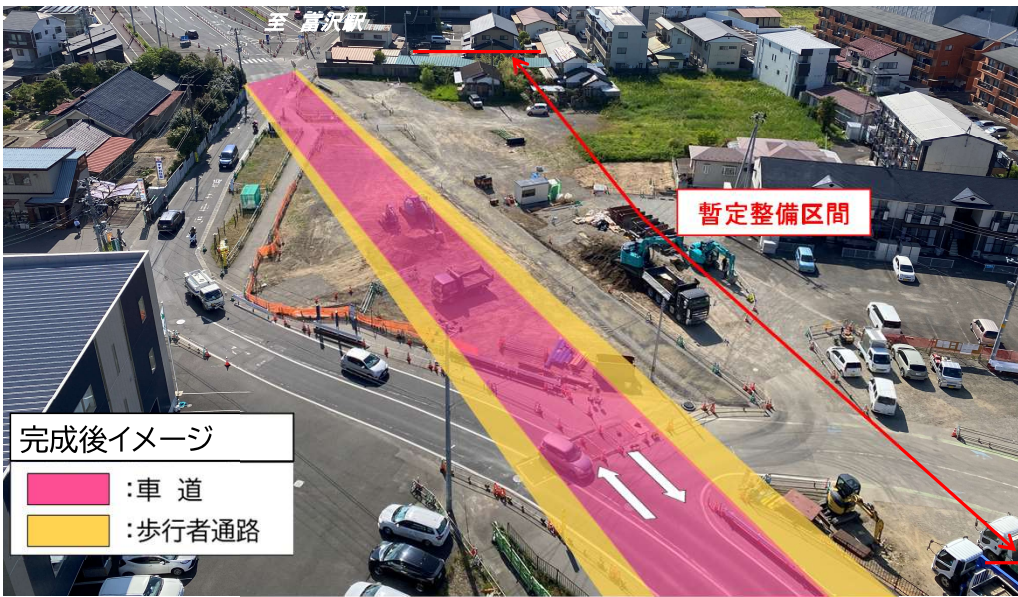

完成後イメージ

- : 車道
- : 歩行者通路

工種	内容	
① 準備工	工事着手の準備等を行います	完了
② 構造物の撤去	既設の水路を撤去します	完了
③ BOXカルバート設置	水路撤去した場所にBOXカルバートを設置します	完了
④ 舗装準備	舗装をするために、地面を掘削し砕石で整地します	~6月末まで
⑤ 舗装(車道・歩道)	アスファルト舗装し、白線などの区画線を引きます	~6月末まで
⑥ 後片付け	現場事務所及び看板類を撤去します	7月上旬頃~

お問い合わせ先

- 事業全般に関して(発注者) 仙台市建設局 道路部 南道路建設課 道路第二係 (☎022-214-8409)
- 橋梁施工に関して(施工業者) 株式会社広瀬組 庄子・猪瀬 (☎022-392-4620)
- 道路工事に関して(施工業者) 株式会社朋栄土木 木村 (☎022-393-4215)

◇◇ 護岸整備工事について ◇◇

現在、橋の土台が完成し**護岸ブロック**を設置する作業を実施しています。護岸整備作業を7月ころまで行います。護岸整備作業が完了後、現場事務所および現場内に設置している看板を撤去予定です。



工種	内容	
① 準備工	工事着手の準備等を行います	完了
② 橋台新設(土留・掘削)	土留設置(鋼矢板圧入等)後に掘削します	完了
③ 橋台新設(鉄筋)	橋台の骨組みとなる鉄筋を組み立てます	完了
④ 橋台新設(打設)	コンクリートを打設し橋台を造ります	完了
⑤ 護岸整備	橋台の前面に護岸を整備します	~7月まで
⑥ 後片付け	現場事務所及び看板類を撤去します	

〽-----各種関連工事を実施しています-----〽

新たな道路への**ライフライン**(下水道・水道・ガスなど)の埋設工事(本線北側)を、順次実施しております。詳細については各工事ごと、近隣住民の皆様へ担当部署よりお知らせいたします。

ライフライン工事予定

- 下水道 : 仙台市 建設局 管路建設課
- 水道 : 仙台市 水道局 南配水課
- ガス : 仙台市 ガス局 建設課
- 通信 : NTTインフラネット株式会社

