

# 宮沢根白石線(南鍛冶町工区) 工事だより

『宮沢根白石線(南鍛冶町工区)工事だより(第6号)』の発刊にあたって

地域の皆様には、日ごろより仙台市の行政運営にご理解、ご協力を頂き感謝申し上げます。  
4月より上部工工事の施工を開始しまして2ヶ月ほどが経ちました。現在は先行して、その3工事の施工を行っています。5月14日から19日の6日間で橋桁42本を夜間に現場へ運搬し、大型クレーンを使用して橋桁の架設を完了しました。  
その4工事については、工場で橋桁63本の製作を行っており、7月中旬に橋桁の架設を予定しています。引き続き、大型車両の出入り等により、近隣の皆様にはご迷惑をお掛けしますが、何卒よろしく申し上げます。なお、気になる点、ご不明な点がございましたら、下記連絡先までご連絡ください。

## 工事の予定



日程	平成30年3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
工事予定内容 (その3)	現場内整地			支保工			主桁架設			横組工																							
大型特殊車両通行 予定日 (その3)																																	
工事予定内容 (その4)	現場内整地			支保工			主桁架設			横組工																							
大型特殊車両通行 予定日 (その4)																																	



その3工事主桁架設完了(県道荒井荒町線沿いから撮影)



その3工事主桁架設完了(橋面上から撮影)

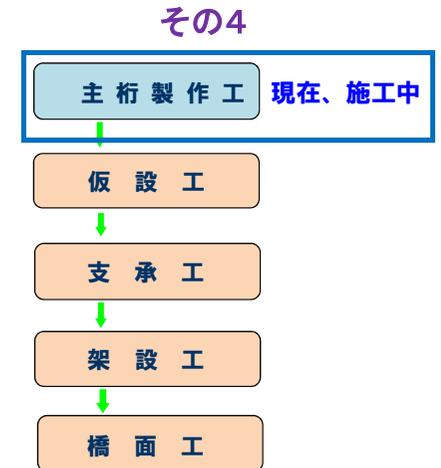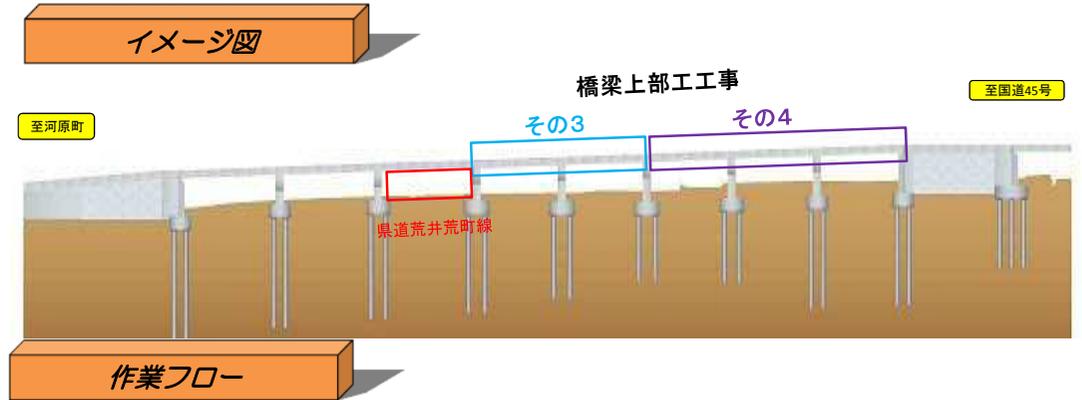

先日完了した架設工事



現在主桁製作



## お問い合わせ先

発注者  
仙台市建設局道路部南道路建設課道路第一係  
担当 齊藤 龍也(さいとう たつや)  
成田 幸久(なりた ゆきひさ)  
高瀬 朝子(たかせ あさこ)  
TEL 022-214-8378

## 上部工工事の施工業者

請負者 東日本コンクリート株式会社  
その3工事担当 栗原 悠(くりはら ゆう)  
その4工事担当 畠山 慎吾(はたけやま しんご)  
TEL 022-226-8028

