

【第 9号】

都市計画道路

みなみこいずみもにわせん みやざわばしこうく こうじ


南小泉茂庭線(宮沢橋工区)工事だより

【ごあいさつ】

地域の皆さまには、日頃より市政にご理解・ご協力を頂き、感謝申し上げます。  
宮沢橋工区は、令和元年から橋の土台となる橋台・橋脚工事を進めており、今年度内に全て完成する見込みです。今後は、上部工(橋桁)工事や若林区側の擁壁工事を進めていきます。  
今後とも、ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。

工事の進捗状況

太白区側の橋台工事は3月、河川内の橋脚工事は6月に完成しました。  
若林区側の橋台工事は、堤防の復旧を終え、今年秋頃に完成する見込みです。

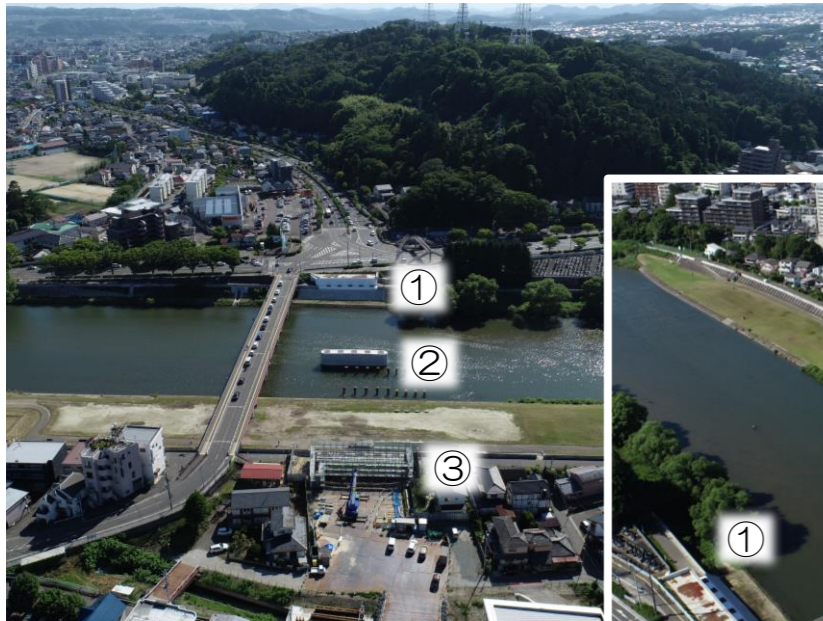

令和4年6月現在

「宮沢橋」事業スケジュール【完成時期を修正しました】

開通時期について、これまで令和6年度中の完成を目標に進めてまいりましたが、急激な社会情勢の変化により、鋼材等の入手に時間を要しております。このため、現時点において具体的に完成時期を示せない状況ではありますが、今年度からは、「若林区側の擁壁工事」や「上部工の工場製作」に着手する予定であり、引き続き、宮沢橋工区の早期完成を目指し、事業を推進してまいります。

工 種	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度～
①太白区側橋台工事	完了					
②橋脚工事	完了					
③若林区側橋台工事						
④若林区側擁壁工事			工場製作	現場工事		
⑤上部工工事						
⑥関連工事						
⑦旧宮沢橋撤去工事						

(スケジュールは、今後変更になる場合があります。)

川の水が少ない期間(渇水期)

今年度予定している工事

若林区側の擁壁工事に着手する予定です。急患センター裏側の道路(市道石名坂堰場1号線)は、当面、これまでどおり通行できます。上部工工事は、今年度から約1年かけて工場製作を行い、現場着手は川の水が少なくなる令和5年11月からを予定しております。



【事業に関するお問合せ・工事の発注者】

仙台市 建設局 道路部 南道路建設課  
道路第一係 担当：及川・今成・山田  
電話：022-214-8378 (係直通)

【工事に関するお問合せ・工事の施工業者】

③若林区側橋台工事(令和3年9月～)  
株式会社橋本店(はしもとてん)  
担当：高橋  
電話：022-399-9455



下記工事の施工業者は未定ですが、決定次第お知らせします。

- ④若林区側擁壁工事
- ⑤上部工工事
