

【第2号】


都市計画道路

みなみこいずみもにわせん みやざわばしこうく こうじ

南小泉茂庭線(宮沢橋工区)工事だより

工事の進捗について

日頃より仙台市政にご理解・ご協力を頂き、心より感謝申し上げます。
11月より、新しい橋の工事を着手しております。定期的に工事だよりを発行させていただき、地域の皆様へ工事の進捗を報告させていただきます。

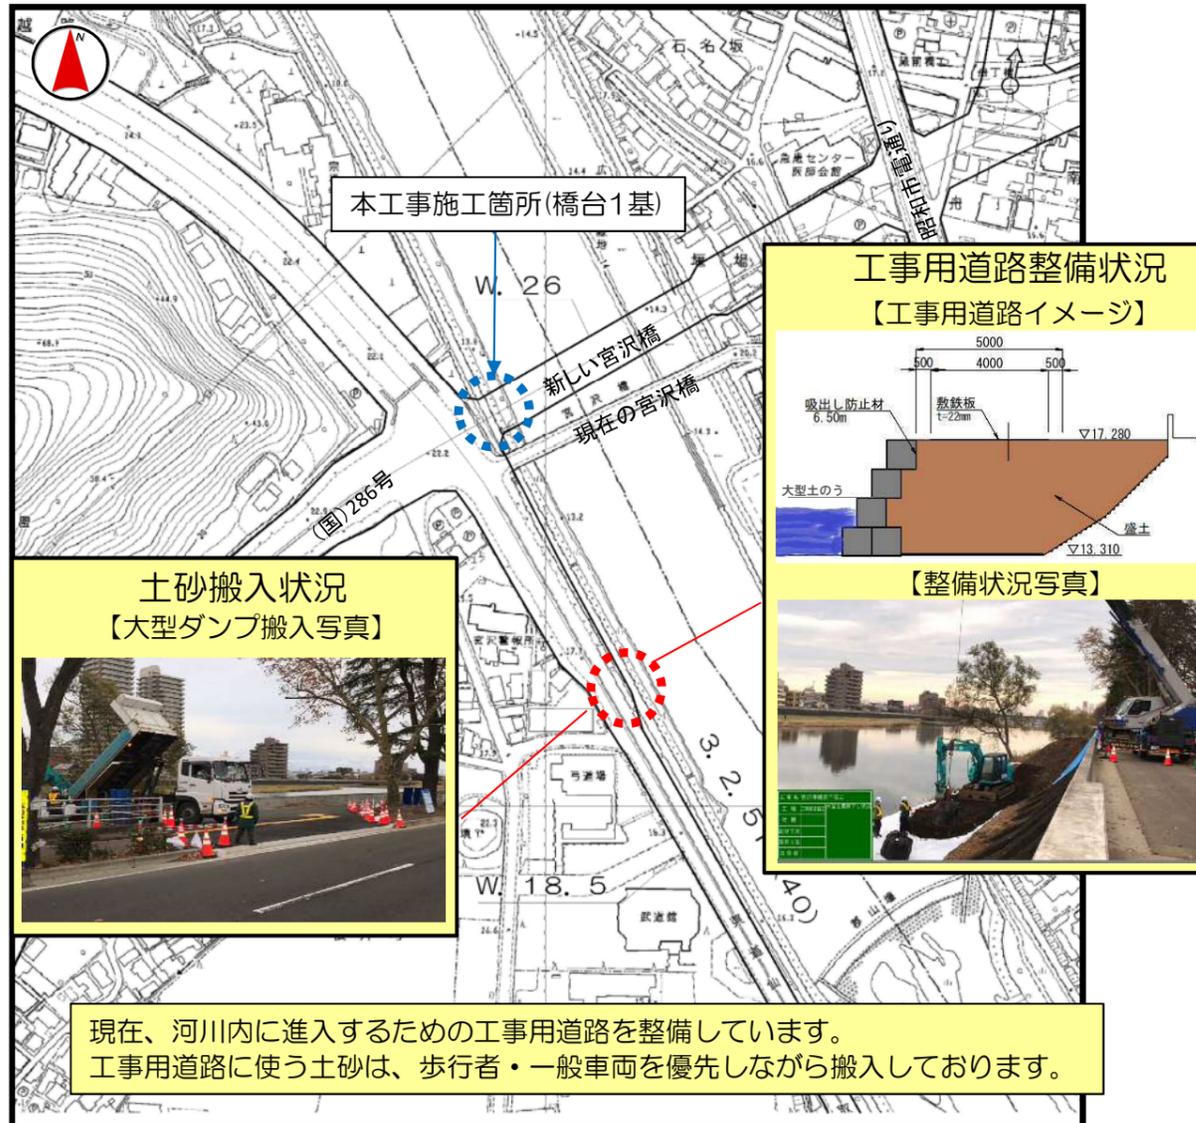

現在、河川内に入内するための工事用道路を整備しています。
工事用道路に使う土砂は、歩行者・一般車両を優先しながら搬入しております。

【今後の工事内容】

①土留工

河川区域内での土工、構造物取壊しを行う前に周辺に土留として鋼矢板を打込みます。

打込みする際は、下の写真のように鋼矢板を吊上げて、圧入機という機械を用いて土中に打込みを行います。



②護岸取壊し

①完了後、護岸を取壊しします。取壊しは油圧ブレーカーという機械を使って行います。

油圧ブレーカー使用時は音が出ますので、ご迷惑等をおかけしますが何卒宜しくお願い致します。



出典 一般財団法人建設物価調査会

「写真でみる土木工事施工手順土木施工の実際と解説 上巻」

【工程表】

令和2年度工程表

	1月			2月			3月			4月			5月			6月		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
伐採工																		
仮設工																		
土留・仮設工・護岸取壊																		
場所打杭工																		
仮設工(閉鎖準備)																		

年末年始のお休み

12月28日(土)~1月5日(日)

※R2.11月より施工を再開

【事業に関するお問合せ・工事の発注者】

仙台市役所建設局 道路部 南道路建設課
道路第一係 担当：齊藤(さいとう)・大友(おおとも)
電話：022-214-8378(係直通)

【工事に関するお問合せ・工事の施工業者】

株式会社橋本店
担当：高橋(たかはし)・尾本(おもと)
電話：022-748-4075

★この広報誌は、仙台市HP上でもご覧いただけます。

仙台市ホーム> ぐらしの情報> 住みよい街に> 交通> 工事のお知らせ(若林区、太白区、東部復興道路)
