

【第11号】

都市計画道路

みなみこいずみもにわせん みやざわباشこうく こうじ


南小泉茂庭線(宮沢橋工区)工事だより

【ごあいさつ】

地域の皆さまには、日頃より市政にご理解・ご協力を頂き、感謝申し上げます。
宮沢橋工区は令和4年10月に橋台・橋脚工事が完成し、現在は若林区側の盛土擁壁工事や上部工(橋桁など)の工場製作を進めているところです。
今後ともご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。

① 若林区側の盛土擁壁工事の進捗状況について

令和4年12月から施工しております盛土擁壁工事は、現在盛土作業を実施しております。
なお、工事の完成は令和5年7月末を予定しております。

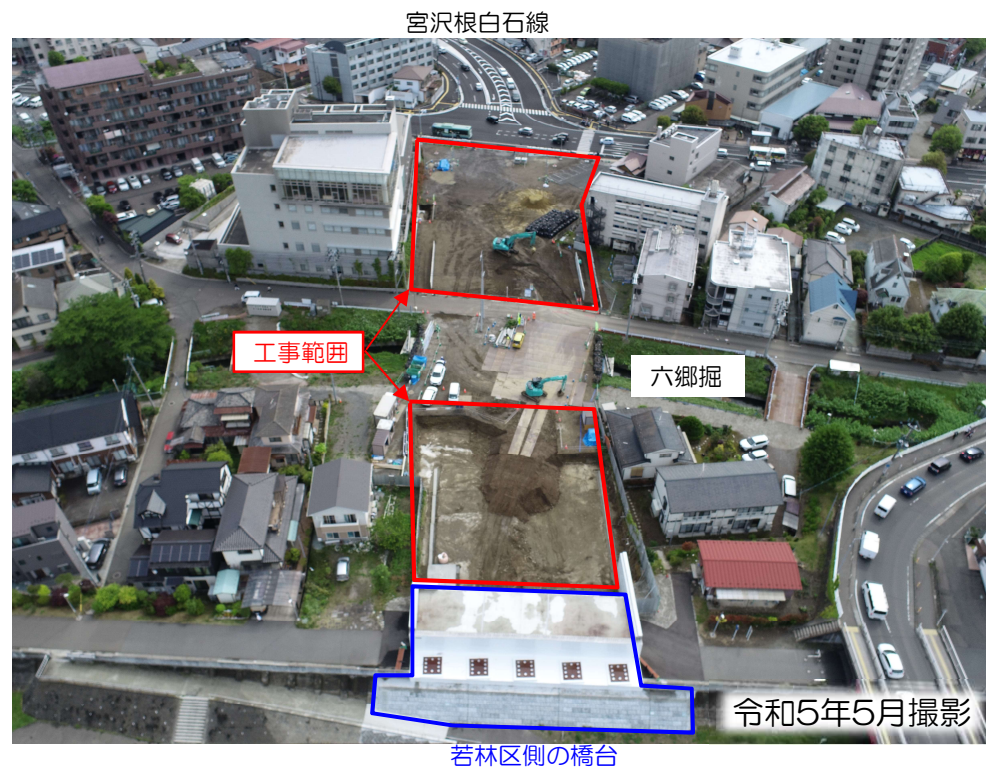

② 上部工(橋桁)は工場での製作を行っています

令和5年11月頃に現場で架設開始予定の宮沢橋上部工工事では現在、橋桁などの工場製作を行っています。

鋼製の橋梁は、工場において車両で運搬できる大きさのブロックまで加工・塗装したのち、現場でブロックを連結・組立して架設します。



上部工工事の流れ

令和5年5月末現在

令和5年11月

令和7年4月

令和8年3月(完成工期)

橋桁などの工場製作

- ・鋼材の加工
- ・仮組立
- ・橋桁の塗装など

橋桁Aの架設(若林区側)

橋桁Bの架設(太白区側)

コンクリート床版工

アスファルト舗装工

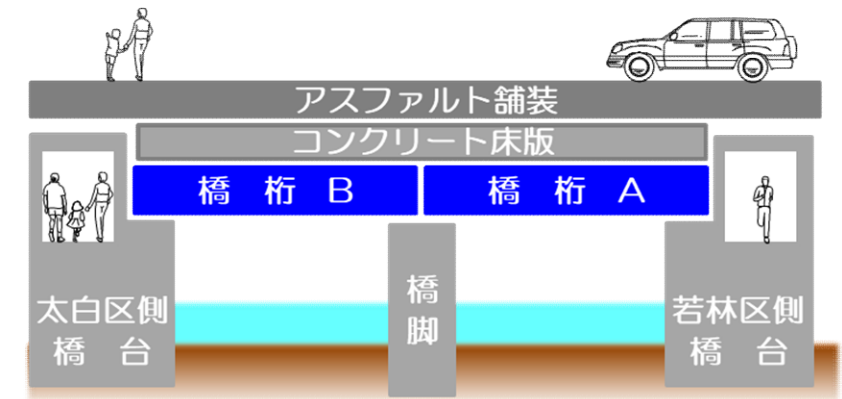


図-1 橋を横から見たイメージ

上記に示した時期は現時点での予定ですが、資材の供給状況等により変わることがあります

③ 宮沢橋上部工工事のHP開設について



現在工場製作を行っている宮沢橋上部工工事について、新たにHPを開設しました。
<URLはこちら↓>
<https://miyazawabridge.com/>



HPでは工事概要のほか、現場の進捗状況や宮沢橋についての技術的な情報などを掲載しておりますので、工事だよりと併せてご覧ください。

【事業に関するお問合せ・工事の発注者】

仙台市 建設局 道路部 南道路建設課
道路第一係 担当：及川・川野
電話：022-214-8378 (係直通)

【工事に関するお問合せ・工事の施工業者】

(都)南小泉茂庭線(宮沢橋工区)道路改築工事(その1)
株式会社橋本店 (はしもとてん)
担当：高橋
電話：022-399-9455



(都)南小泉茂庭線(宮沢橋工区)橋梁上部工工事

こまい 駒井ハルテック・みついすみともけんせつてっこう かくとう
共同企業体



三井住友建設鉄構エンジニアリング株式会社



市ホームページ
二次元バーコード

