

【第15号】

都市計画道路

みなみこいずみもにわせん みやざわばしこうく こうじ

南小泉茂庭線(宮沢橋工区)工事だより

① 太白区側の橋桁を架けています

太白区側への送出し架設が7月から始まりました。3月に架け終えた若林区側の橋桁上で、仮設桁(手のべ機)と本体橋桁の組み立てを行い、油圧ジャッキによる送り出しを行っております。

仮設桁が太白区側へ到達後の9月下旬からは、昼夜間での作業となります。




令和6年7月13日



令和6年7月24日


▲2週間に1度、約17m送り出しています。



▲7月上旬



▲8月上旬

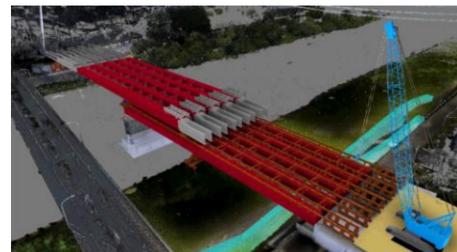

▲9月上旬


(計画アニメーションより抜粋)

② 国道286号の一部規制を行います(8月26日~11月25日)

太白区側への仮設桁到達後、仮設桁の分解、搬出を宮沢橋交差点内で行います。歩道部に大型クレーンや搬出車両を設置するため、宮沢橋交差点の終日規制(車線減少、歩道切替)を実施します。通行の際は、案内看板や交通誘導員の誘導にご協力をお願いします。



▲ 通常の通行形態(現在)

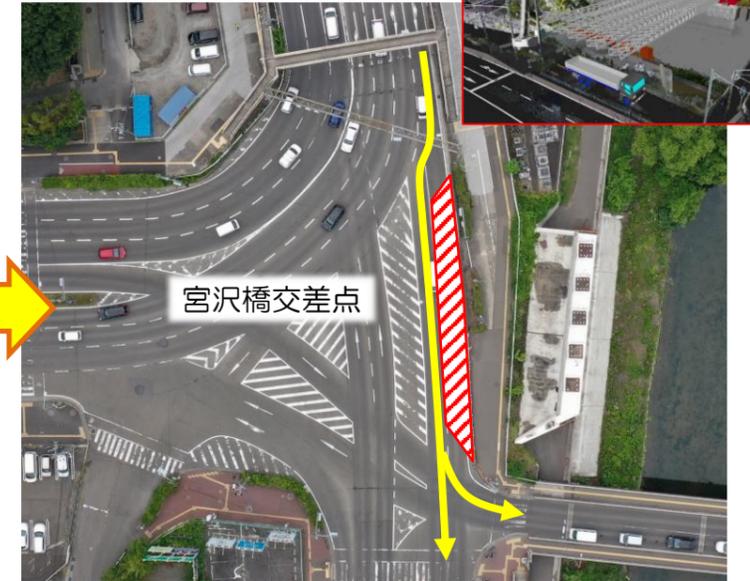

▲ 令和6年8月26日~令和6年11月25日

車線減少エリア

③ 送り出し工法の舞台裏

送り出しを行っているときは、センサーで確認するとともに、現場にいる全員が異常音や橋桁のねじれなどが無いかを目と耳で確認しており、静かな現場(広瀬川のせせらぎや鳥のさえずりが聞こえるくらい)となっております。



▲ジャッキは電子制御により、10台すべてが連動しています。1台で50tまで押せます。



▲すべてのジャッキが正常に作動しているか、異常音がないかなど監視しています。

【事業に関するお問合せ・工事の発注者】

仙台市 建設局 道路部 南道路建設課
道路第一係 担当：及川・岩館
電話：022-214-8378(係直通)




【工事に関するお問合せ・工事の施工業者】

いつ・どんな作業をしているの? 「宮沢橋橋梁上部工工事Webサイト」に掲載しています。

Q宮沢橋上部工

検索

(都)南小泉茂庭線(宮沢橋工区)橋梁上部工工事



こまい 駒井ハルテック・三井住友建設鉄構エンジニアリング・角藤 共同企業体

担当： こん ないとう いしだ
今 内藤 石田
電話： 022-796-1561

