

【第12号】

都市計画道路

みなみこいずみもにわせん みやざわばしこうく こうじ

南小泉茂庭線(宮沢橋工区)工事だより

① 若林区側盛土擁壁の一部が完了しました


令和4年12月から施工しておりました盛土擁壁工事は、8月末に完了しました。工事に対する皆様のご理解とご協力に感謝申し上げます。

完成した盛土部分は、上部工工事に於いてクレーン等の作業スペースとして利用します。



② 若林区側橋桁（橋桁A）の製作が完了しました

現在、宮沢橋上部工工事は橋桁などの工場製作を行っており、若林区側の製作が完了しました。橋桁は工場において塗装した後、現場まで運搬します。

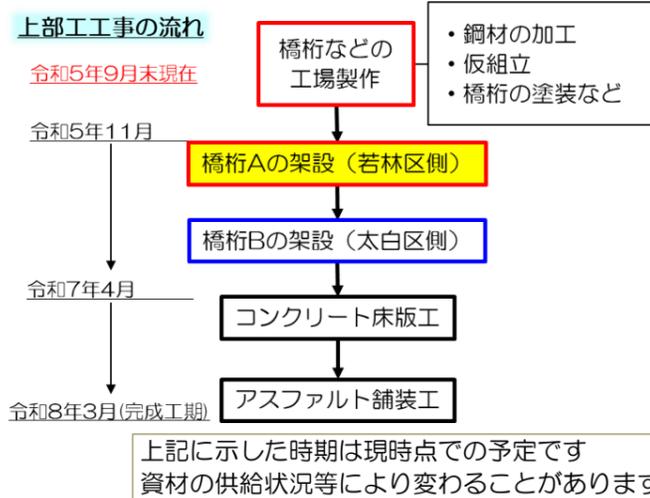

③ 上部工工事は11月から現場に着手します

若林区側上部工工事（橋桁Aの架設）を11月から着手します。工事では、橋桁を大型クレーンで吊り上げて、新しい橋台と橋脚の上に設置します。重機や資材等は、広瀬橋の上流から河川敷を通過して施工する場所まで運搬します。



▲大型クレーンによる橋桁架設のイメージ



▲工事車両の通行経路

▼工事期間中の歩行者通路について

- ・堤防上部の河川管理用通路は、工事期間中も通行できます。
- ・河川敷の通路は、工事の時期によって変わることがあるため、現地の案内看板にて掲示します。

④ 宮沢橋上部工工事のホームページを開設しています



- ・上部工工事のホームページを開設しています。
- ・工事概要、進捗状況、次週までの工程表などを掲載しております。ぜひご覧ください。

<URLはこちら↓>

<https://miyazawabridge.com/>

宮沢橋上部工工事

検索



【事業に関するお問合せ・工事の発注者】


仙台市 建設局 道路部 南道路建設課
 道路第一係 担当：及川・大原
 電話：022-214-8378（係直通）

【工事に関するお問合せ・工事の施工業者】

(都) 南小泉茂庭線(宮沢橋工区) 橋梁上部工工事

こまい 駒井ハルテック・みついすみともけんせつてっこう かくとう
 駒井ハルテック・三井住友建設鉄構エンジニアリング・角藤 共同企業体

担当： こん だいすけ
 今 大介
 電話： 022-796-1561



市ホームページ
二次元バーコード

