

より深く地盤を掘削するための山留工事が進んでいます

下水管盛替え工事が進んでいます

地盤の掘削工事が進んでいます

市民広場側では地下連絡通路整備にあたっての試掘工事をしています

【地盤の掘削工事】

山留工事をしたのち、掘削工事を進めています。およそ深さ3.5mまで掘削しました。これからさらに深さ10mくらいまで、掘削を進めていきます。



拡大



深さ3.5m

【下水道の盛替え工事】

地下鉄連絡通路整備の工事に先立ち、土の中に埋まっている下水道管の盛替え工事（排水管や樹の新設）を実施しました。



新設樹




新設排水管

【仮囲い・環境美化対応】



仮囲いのイメージアップ
夜にはライトアップもされます

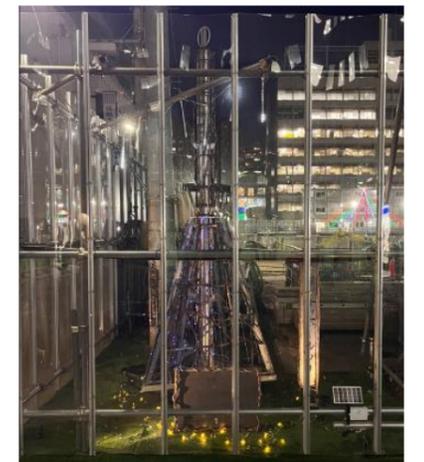

二代目庁舎の鉄筋を活用した
モニュメントを展示しました
