

[様式第13号]

[制限付き一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 平成25年度(仮称)仙台市落合復興公営住宅新築工事

整理番号	
130510277	
質 問 事 項	回 答
1. 集会所工事(別途工事)の発注時期についてご指示願います。	1. 平成26年7月頃を予定しております。
2. 階段スクリーンと落下防護ネットについて、A-2特記仕様書(2)で7章鉄骨工事は消され、A-5特記仕様書(5)ではユニット及びその他工事に分類されておりますが、S-01構造設計特記仕様書では鉄骨工事の記載が有ります。鉄骨工事とし、製作工場はMグレード以上と考えて宜しいでしょうか。ご指示願います。	2. 非構造部材であるため、ユニット及びその他工事に分類しておりますが、目隠しパネル鉄骨下地及び落下防護ネット鉄骨下地は、溶接・ボルト接合があることから構造特記仕様書に記載しております。製作工場はMグレード以上とします。
3. 上記で鉄骨工事として扱う場合、S-01構造設計特記仕様書 6.鉄骨工事(6)防錆塗装の項目は今回、鉄骨は全て溶融亜鉛メッキ仕上げのため、該当しないと考えるて宜しいでしょうか。ご指示願います。	3. 図面番号 A-28・29 及び A-53 に記載のとおり、溶融亜鉛メッキ仕上げとします。
4. A-1特記仕様書(1)4章地業工事 03地盤の載荷試験を行なう、S-01構造設計特記仕様書 3.地盤 (2)地盤調査で平板載荷試験の記載が有りますが試験箇所は1箇所と考えて宜しいでしょうか。ご指示願います。	4. 平板載荷試験の試験箇所は1箇所とし、位置については工事着手後、協議により決めることとします。


[様式第13号]

<p>5. 配管ピット底盤について、捨てコン t50 に無機質系塗布防水となっておりますが、捨てコンは通常、土工にてコンクリートを均しますが、塗布防水下地のため均し精度が必要となるので、左官工による防水下コンクリート均しと考えて宜しいでしょうか。ご指示願います。</p>	<p>5. 左官工による金ごて仕上げとします。</p>
<p>6. 配管ピット底盤の釜場について、配筋の有無や納まりについてご指示下さい。また各配管ピットから釜場まで湧水を通す水抜きパイプの取付けは必要ないでしょうか。必要であればパイプの仕様と設置箇所について。ご指示願います。</p>	<p>6. 釜場の配筋等については、別紙のとおりとします。 水抜きパイプの仕様及びヶ所数は、図面番号 A-53 のとおりとします。</p>
<p>7. 造成工事が完了し建築工事が乗り込み可能となるのは何月頃と考えれば宜しいでしょうか、ご指示願います。</p>	<p>7. 平成26年1月より着工予定と考えております。</p>
<p>8. 近隣状況により、(県立子供病院、広瀬高等学校、県営広瀬住宅等) 作業規制、工事車両通行規制は無いものと考えて宜しいでしょうか、ご指示願います。</p>	<p>8. 作業規制はありませんが、保育所の通所時間及び学校の登下校の時間帯の大型車両の通行には配慮が必要となります。</p>
<p>9. 西側工事車両進入路の県営広瀬住宅利用者の駐停車車両は、工事期間中 駐停車禁止となっていると、理解して宜しいでしょうか、ご指示願います。</p>	<p>9. 宜しいです。</p>

[様式第13号]

<p>10. 西側全面道路の放置車両は、工事着手までに撤去されていると、理解して宜しいでしょうか、ご指示願います。</p>	<p>10. 宜しいです。</p>
<p>11. 建築工事着手時までに造成工事の排水工事が終了し、建築工事に伴う雨水等湧水等の排水が広瀬側流域に影響を与えないと理解して、宜しいでしょうか、ご指示願います。</p>	<p>11. 宜しいです。</p>
<p>12. 住宅性能評価は取得するのでしょうか、また、その費用は本工事でしょうか、ご指示願います。</p>	<p>12. 設計住宅性能評価のみを取得します。建設住宅性能評価の取得はしないため本工事での費用負担はありません。</p>

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。

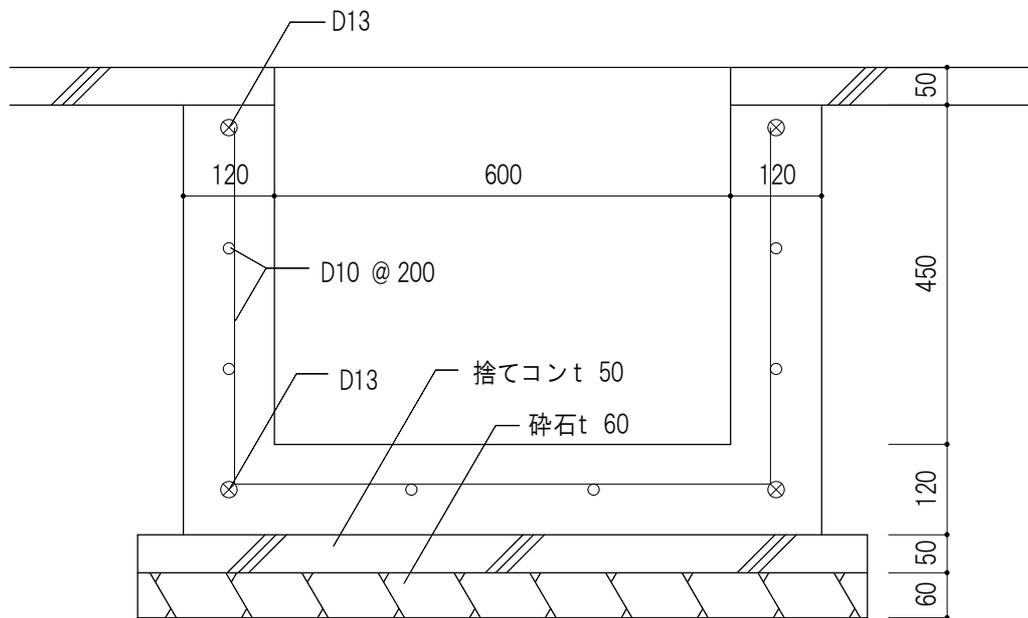

カマ場詳細図 S = 1/10
