

勾当台公園再整備基本計画について

令和5年7月

仙台市建設局百年の杜推進部公園管理課



1. 勾当台公園再整備事業について



市役所本庁舎の建替えに伴う新本庁舎敷地内広場及び勾当台公園市民広場の一体的活用に向けた連携等を背景とし、本市中心部の更なる賑わいづくりや公園の価値向上等を目的に、勾当台公園全体の再整備を実施する。



2. 勾当台公園再整備事業と関連施策

仙台市総合計画

(仙台市基本計画・実施計画)

勾当台・定禅寺通エリアビジョン

(R3.6 策定)

交流とゆとりを楽しむところ ～みんなで育む仙台の庭～

踏まえる

定禅寺通活性化

(R5.3再整備方針)

仙台市役所本庁舎建替事業

(R2.7 基本計画策定)

連携

せんだい都心再構築プロジェクト

(R1.7 策定)

勾当台公園再整備事業

- ・R2～R4 基本構想
- ・R4～R5 基本計画

整合

整合

仙台市みどりの基本計画 (R3～R12)

都市計画マスタープラン
せんだい都市交通プラン
杜の都環境プラン(仙台市環境基本計画)

3. 勾当台公園再整備検討懇話会


勾当台公園の再整備の方針について、公園の利活用や地元まちづくりにおける有識者から専門的な意見を勾当台公園再整備に反映させるために設置。

【勾当台公園再整備検討懇話会委員】

	氏名
座長	もとえ まさしげ 本江 正茂
座長代理	わたなべ かつら 渡部 桂
委員	いわま ゆき 岩間 友希
委員	うばうら みちお 姥浦 道生
委員	しょうじ まき 庄子 真岐
委員	たかやま ひでき 高山 秀樹
委員	ふくおか たかのり 福岡 孝則

※敬称略・委員50音順

【勾当台公園再整備検討懇話会】

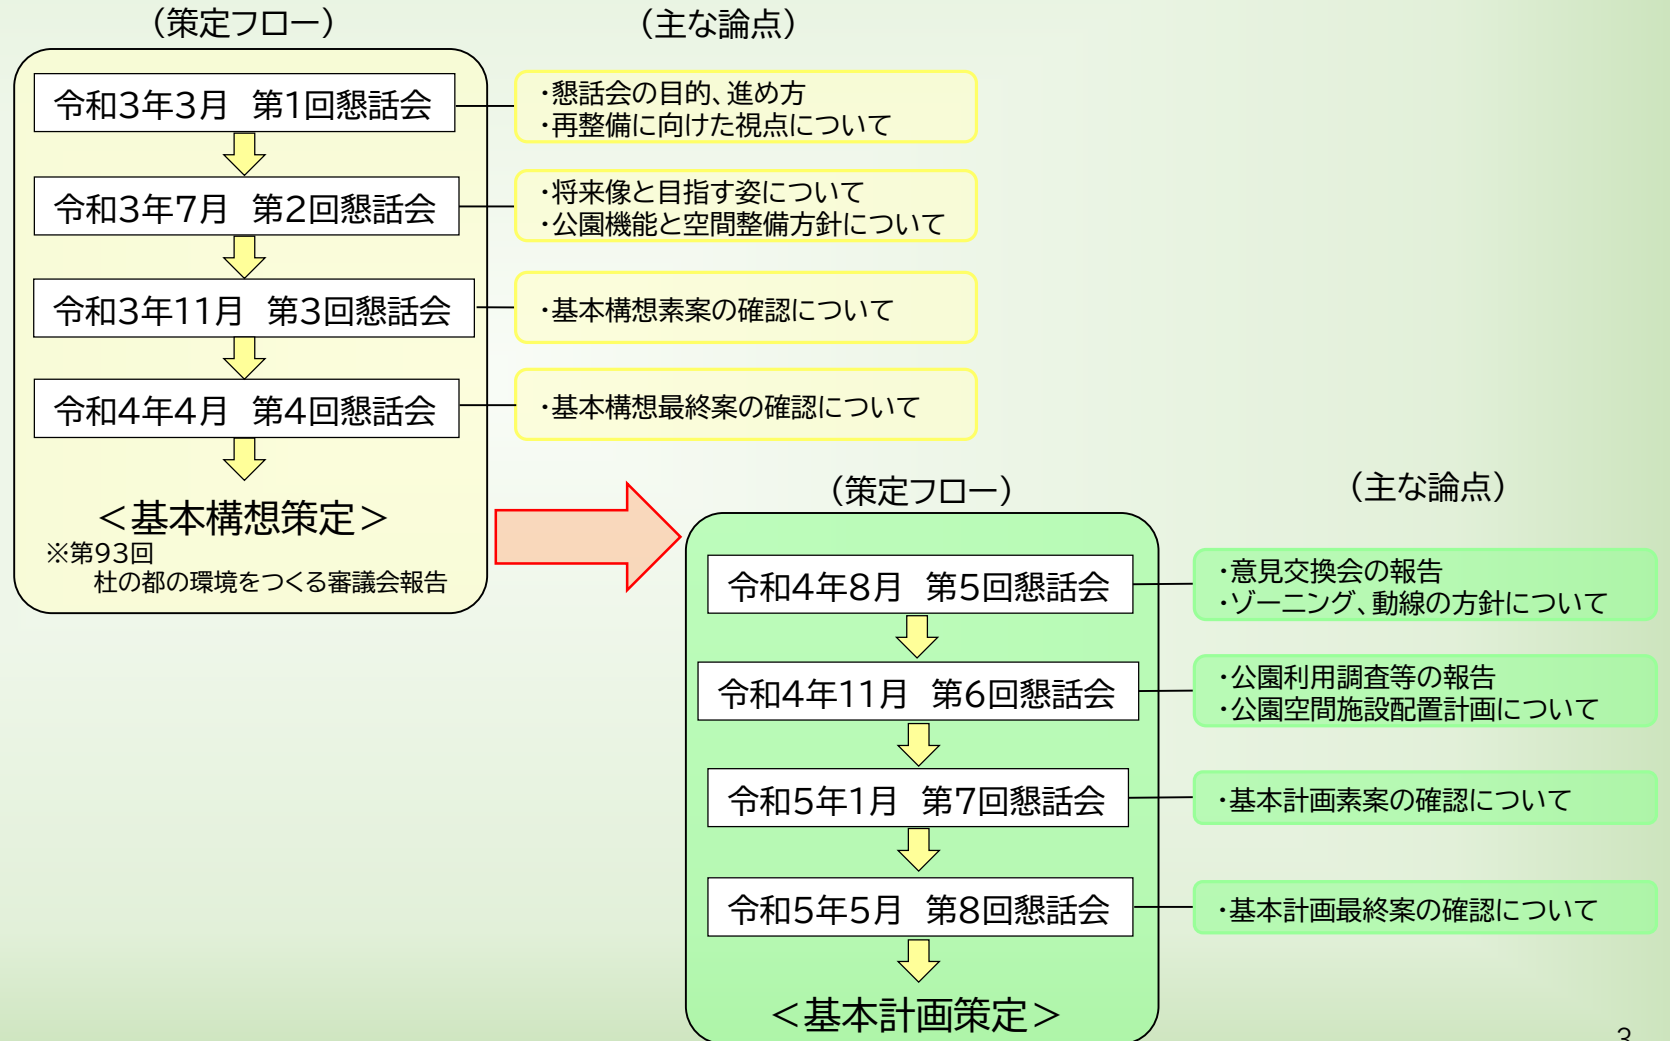

4. 勾当台公園再整備に向けた基本理念と方向性（勾当台公園再整備基本構想）

基本理念(コンセプト)

“Common Garden”

～「ひと」と「まち」をつなぐゆとりとにぎわいの拠点～


“Common Space” × “Garden”

豊かなみどりと人の活動・にぎわいとが調和した「杜の都 仙台」の暮らしの豊かさを実感できる、また新しいこと(市民活動等)へのチャレンジや、思い思いの利用ができる「みんなが使い・育てる私たちが誇りに思う庭」として、仙台のシンボルとなる公園を目指します。

基本的な方向性

1. 仙台ブランドの発信拠点【世界とつながる】
2. 多彩な市民活動による交流と創造の場【人がつながる】
3. 都心のサードプレイス【心がつながる】
4. みどりの回遊拠点【街がつながる】
5. エリアマネジメントの展開【時がつながる】

基本構想図

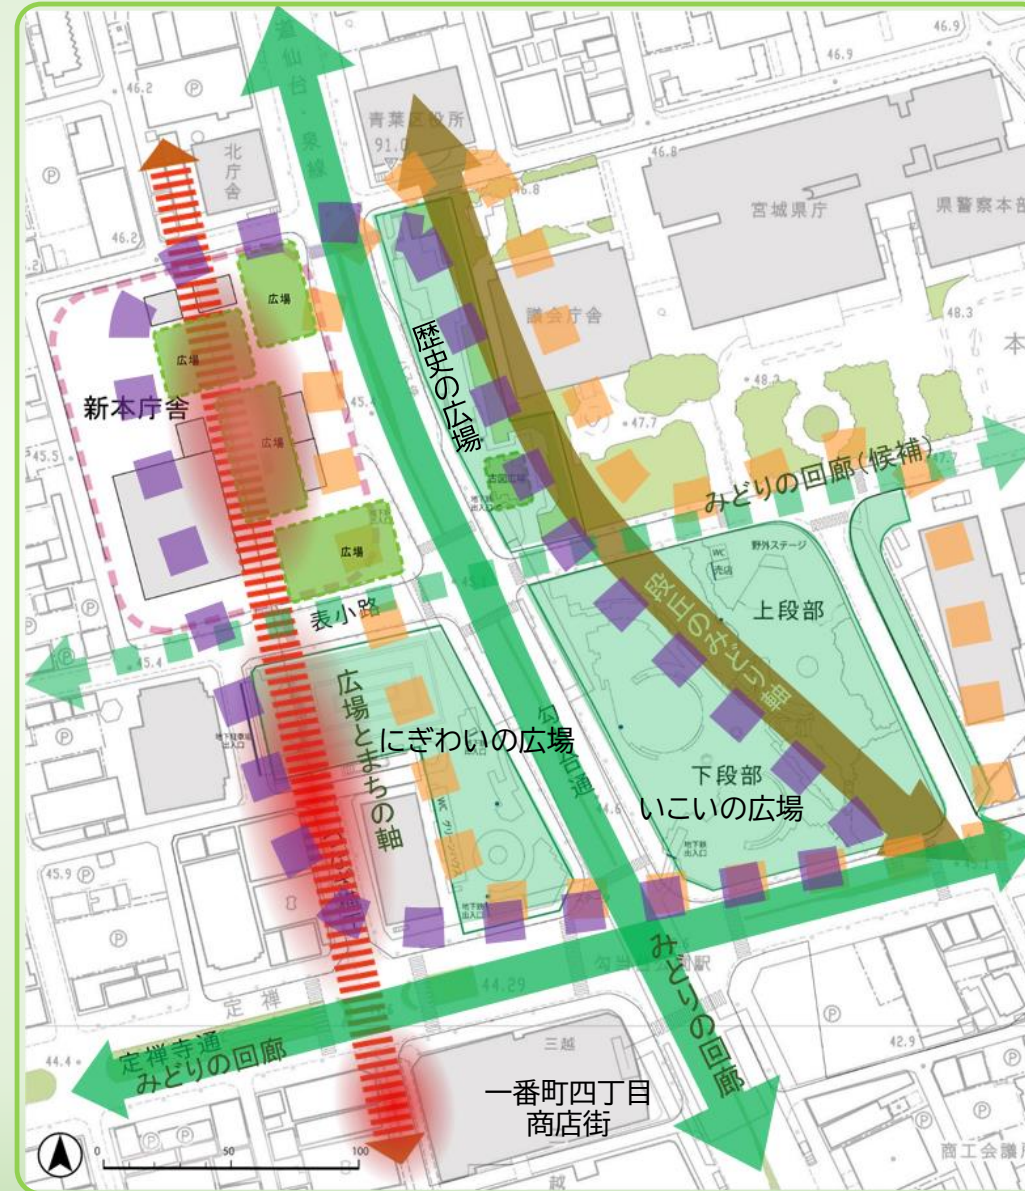


【凡例】

- : 都心部のみどりの回廊 (候補路線含む) 勾当台通・定禅寺通の都心部の緑の回廊による人流・景観軸
- : 広場とまちの軸 一番町商店街・つなぎ横丁から新本庁舎へつながる空間軸
- : 段丘のみどり軸 都心に残された河岸段丘の崖面による景観軸
- : にぎわいゾーン: (新本庁舎・表小路・にぎわい広場～いこいの広場下段部)
- : いこいのゾーン: (新本庁舎・歴史の広場・宮城県庁～いこいの広場上段部)
- : 勾当台公園区域

6. 各広場の再整備計画内容

①にぎわいの広場

現況

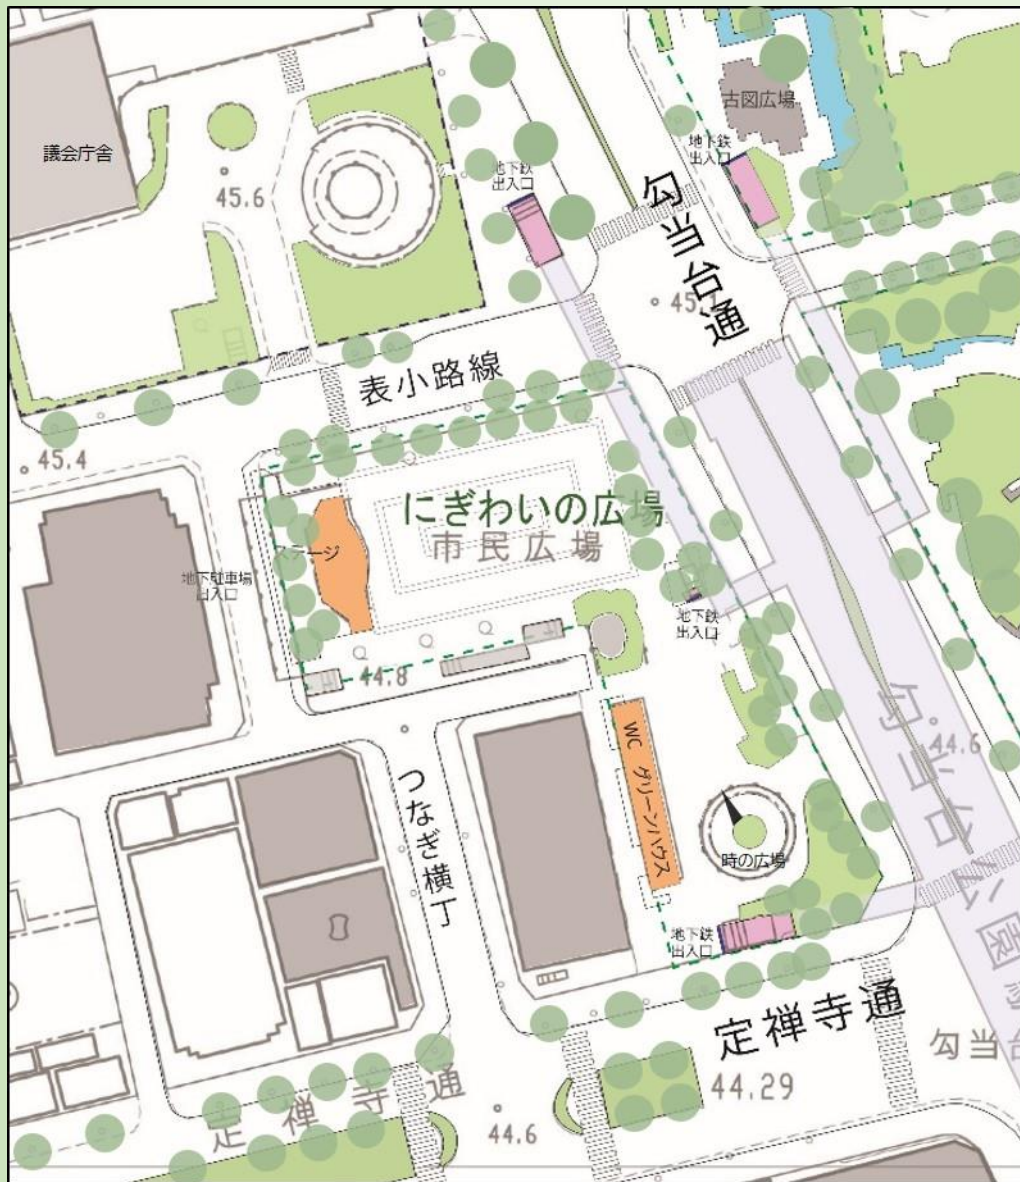

再整備後



6. 各広場の再整備計画内容

②いこいの広場

現況



再整備後



6. 各広場の再整備計画内容

③かたらいの広場

現況



再整備後

植栽帯を整理しスロープや通行動線を整備

水路際をステップ状にし、親水空間として整備

植栽帯の一部を撤去し、歩道幅員を確保するとともに出入口を整備

広場中央のジオラマを改修し、広い滞留空間を整備




7. 再整備スケジュール

①基本的な考え方

勾当台公園は多種多様なイベント会場として年間270日程度利用されている公園であり、イベントなどの利用が継続できるように、段階的に3つの広場の再整備工事を実施する。

②段階的年次計画概要

- ・再整備工事範囲、工種も多岐にわたることから、長期間の工事となるため第1期工事と第2期工事に区分した段階的再整備工事とする。
- ・第1期は、令和6年度から「にぎわいの広場(市民広場)」の代替広場として、「いこいの広場」下段部の一部に設ける仮設広場の工事を行い、仮設広場完成後に「にぎわいの広場」と「かたらいの広場」を対象に令和7年度から令和9年度にわたって再整備工事を実施する。
- ・第2期は、令和10年度から「いこいの広場」の再整備工事を実施する。

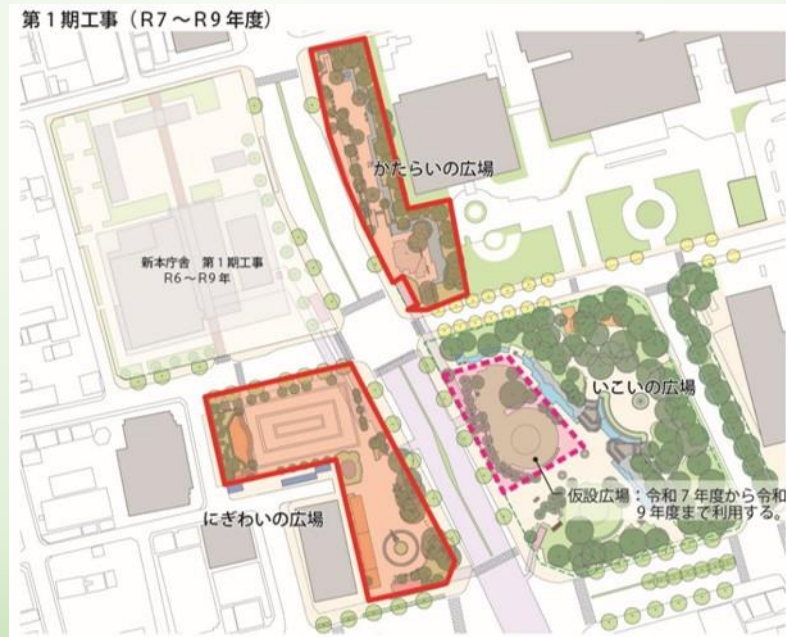

7. 再整備スケジュール

③ 勾当台公園再整備及び関連事業スケジュール

年 度	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	
勾当台公園	基本計画	基本設計	実施設計	にぎわいの広場工事			市役所本庁舎供用開始 (第一期)				市役所本庁舎供用開始 (第二期)
				かたらいの広場工事				いこいの広場工事			
※仮設広場		設計	工事	仮設広場供用							
本庁舎	実施設計										
		解体	第Ⅰ期工事			第Ⅱ期工事					
表小路・ つなぎ横丁		検討・設計			工事						
定禅寺通	★ 方針策定	測量調査設計	工事								
